

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | <b>K4053</b>                                                                          |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

## Acta de Proyecto

### **PROYECTO:**

***“Plataforma Integral para la Gestión y  
Administración de Becas Académicas (Beca360)”***

### ***Profesores:***

***Profesor a cargo del curso: Mg. Ing. Gabriela Salem***

***Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa***

|                                                                                   |                                                                                       |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                   | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                   | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

## Historial de Revisión

| Fecha      | Versión | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   | Rol      | Autor           |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 06/06/2026 | 1.0     | Desarrollo del título, objetivo del proyecto y objetivo del producto.                                                                                                                                                                         | Fundador | Joseph Mansilla |
| 16/06/2026 | 1.1     | Desarrollo del sumario ejecutivo, beneficios al negocio y entregables del proyecto: Canvas y WBS.<br>Actualización y correcciones del título, objetivo del proyecto y producto.<br>Reimaginación del logo.                                    | Fundador | Joseph Mansilla |
| 18/06/2026 | 1.2     | Desarrollo de matriz de riesgos.                                                                                                                                                                                                              | Fundador | Joseph Mansilla |
| 02/07/2026 | 1.3     | Desarrollo de la matriz de evaluación.                                                                                                                                                                                                        | Fundador | Joseph Mansilla |
| 07/07/2026 | 1.4     | Desarrollo de la matriz de roles y responsabilidades. Agrego detalles del alcance, autoridad y responsabilidad del Project manager, restricciones, riesgos identificados del proyecto, supuestos y el organigrama del proyecto de la empresa. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 07/07/2026 | 1.5     | Desarrollo de matriz de interesados y matriz de comunicaciones. Corrección de errores                                                                                                                                                         | Fundador | Joseph Mansilla |
| 13/08/2026 | 1.6     | Desarrollo de acciones de calidad, estrategia de cambios y requerimientos adicionales,                                                                                                                                                        | Fundador | Joseph Mansilla |
| 13/08/2026 | 1.7     | Desarrollo del plan a alto nivel y del cronograma.                                                                                                                                                                                            | Fundador | Joseph Mansilla |
| 27/08/2026 | 1.8     | Desarrollo de planilla de costos, enfoque de implementación de proyecto y enforque de implementación del producto (puesta en marcha).                                                                                                         | Fundador | Joseph Mansilla |

|                                                                                             |                                                                                       |            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UTN.BA | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                             | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                             | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

## Acta del Proyecto

### Título del Proyecto:

Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

### Sumario Ejecutivo:

En la actualidad, las instituciones educativas, fundaciones y organismos que administran programas de becas suelen gestionar sus convocatorias mediante procesos descentralizados y herramientas poco integradas. La publicación de becas, la recepción de postulaciones, la validación de documentación, la evaluación de candidatos y el seguimiento de los beneficiarios suelen realizarse a través de múltiples sistemas o procedimientos manuales que demandan una importante inversión de tiempo y recursos.

Esta situación genera dificultades para garantizar la trazabilidad de las postulaciones, incrementa el riesgo de errores administrativos y retrasa la comunicación de resultados a los estudiantes. Asimismo, limita la capacidad de las instituciones para obtener información consolidada que facilite la planificación, el control y la toma de decisiones estratégicas relacionadas con los programas de ayuda económica.

Con el objetivo de afrontar esta problemática, se propone el proyecto **Beca360**, una plataforma integral destinada a centralizar, digitalizar y optimizar el proceso completo de administración de becas académicas. La solución permitirá a las instituciones gestionar convocatorias, administrar postulaciones, validar documentación, evaluar candidatos, realizar el seguimiento de las becas otorgadas y obtener indicadores de gestión mediante una única plataforma.

Desde la perspectiva del negocio, el proyecto busca optimizar los procesos administrativos asociados a la gestión de becas, reducir los tiempos operativos, incrementar la transparencia y trazabilidad de las decisiones, mejorar la administración de los recursos institucionales y fortalecer la experiencia de los estudiantes durante todo el proceso de postulación.

La implementación de Beca360 representa una oportunidad para modernizar la gestión institucional, incrementar la eficiencia operativa y acompañar los procesos de transformación digital de universidades, fundaciones y organismos responsables de la administración de programas de becas.

### Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar una plataforma integral destinada a digitalizar y optimizar el proceso de gestión y administración de becas académicas, con el propósito de incrementar la eficiencia administrativa, fortalecer la transparencia y trazabilidad de las decisiones y mejorar la administración de los recursos institucionales.

### Objetivo del Producto

Desarrollar una plataforma web que permita a universidades, fundaciones y organismos administradores de becas gestionar de manera centralizada sus programas de ayuda económica, facilitando a los estudiantes la postulación y el seguimiento de sus solicitudes.

- Gestionar convocatorias de becas.
- Administrar postulaciones.
- Validar documentación presentada por los estudiantes.

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | <b>K4053</b>                                                                          |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

- Evaluar candidatos según criterios definidos por cada institución.
- Realizar el seguimiento del estado de las solicitudes y de las becas otorgadas.
- Generar indicadores y reportes para la gestión institucional.
- Centralizar la información relacionada con programas de becas y beneficiarios.

### Beneficios al Negocio

- Optimización de los procesos administrativos.
- Centralización de la información relacionada con becas y postulantes.
- Reducción de los tiempos de gestión y evaluación.
- Incremento de la transparencia y trazabilidad de las decisiones.
- Disponibilidad de indicadores y reportes para la toma de decisiones.
- Mejor administración de los recursos destinados a programas de becas.
- Aumento de la eficiencia operativa del área responsable.
- Estandarización de los procedimientos de evaluación y asignación.
- Mayor seguridad y resguardo de la información institucional y de los estudiantes.
- Fortalecimiento de la transformación digital de las instituciones.
- Mejora en la experiencia de los estudiantes durante el proceso de postulación.
- Incremento de la accesibilidad a los programas de ayuda económica.

### Alcance del Proyecto

#### ¿Qué incluye el proyecto?

**Una plataforma web SaaS multi-institución.** El proyecto contempla el diseño, desarrollo, prueba e implementación de una plataforma web accesible desde navegador, sin instalación en el cliente, que permita a universidades, fundaciones y organizaciones con programas de becas gestionar de forma centralizada y digital todo el ciclo de vida de sus becas. La plataforma opera bajo un modelo de suscripción institucional: la institución contrata el servicio y sus estudiantes lo usan como canal de postulación.

**Módulos funcionales del MVP.** El alcance del primer release comprende cinco módulos core:

- Gestión de convocatorias de becas (creación, publicación, configuración de criterios por institución)
- Gestión de postulaciones (formularios de aplicación, carga de documentación por parte del estudiante)
- Validación documental (revisión, aprobación o rechazo de la documentación presentada)
- Evaluación y asignación de becas (motor de reglas configurable por institución, ranking de candidatos, asignación)
- Reportes e indicadores (dashboards para autoridades institucionales y organismos financiadores)

**Integraciones:** Se incluye en el alcance el diseño e implementación de un mecanismo de integración con sistemas académicos universitarios existentes, tomando como caso base SIU Guaraní, mediante APIs RESTful documentadas y replicables para otros sistemas.

**Infraestructura y seguridad:** El proyecto incluye la definición y puesta en marcha de la infraestructura cloud (arquitectura escalable con auto-scaling), la implementación de políticas de seguridad, cifrado de datos en tránsito y en reposo, y el cumplimiento con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

**Documentación y capacitación:** Están dentro del alcance la documentación técnica del sistema, el manual de usuario para personal administrativo institucional y la ejecución de al menos un ciclo de capacitación con la institución piloto antes del cierre del proyecto.

|                                                                                             |                                                                                       |            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UTN.BA | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                             | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                             | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

**Gestión del proyecto.** Todos los entregables de gestión forman parte del alcance: acta de constitución, WBS, cronograma, matriz de riesgos, plan de comunicaciones, plan de calidad, informes de seguimiento y acta de cierre.

### ¿Qué no incluye el proyecto?

Esto es tan importante como lo anterior, y fue una decisión conceptual central del proyecto:

- **No es un portal público de búsqueda de becas:** Los estudiantes no pueden buscar ni explorar becas de distintas instituciones a través de Beca360. Cada institución gestiona sus propios programas de forma aislada dentro de su instancia.
- **No es un marketplace educativo:** No existe un catálogo abierto donde organismos publiquen becas para que cualquier estudiante del mercado las encuentre.
- **No incluye contenido educativo ni formación académica:** La plataforma gestiona becas, no cursos ni programas de estudio.
- **No incluye aplicaciones móviles nativas** en el alcance del MVP. La accesibilidad móvil se cubre mediante diseño responsivo de la web.
- **No se incluye la migración masiva de datos históricos** de todas las instituciones como entregable garantizado del proyecto; sí se incluye el diseño del proceso y las herramientas de migración, pero la ejecución completa depende de cada institución.
- **No se contemplan integraciones con sistemas de pago** ni gestión financiera directa de los fondos de becas.
- **No incluye módulos de ERP, RRHH ni contabilidad** institucional. Beca360 se limita al ciclo de gestión académica de la beca.

### Criterios de aceptación del alcance

Para considerar el proyecto exitosamente completado, deben cumplirse:

- Los cinco módulos core funcionan end-to-end en ambiente productivo.
- Al menos una institución piloto completó un ciclo completo de convocatoria, postulación, evaluación y asignación en la plataforma.
- Las pruebas de UAT están aprobadas y el informe de QA no registra defectos críticos abiertos.
- La plataforma supera las pruebas de carga con una disponibilidad  $\geq 99,5\%$  durante el período de convocatoria simulada.
- La documentación técnica y el manual de usuario están entregados y aprobados.
- El personal administrativo de la institución piloto completó la capacitación y puede operar la plataforma de forma autónoma.

### Justificación del alcance


El alcance fue deliberadamente acotado al modelo SaaS institucional porque es el más coherente académicamente, el más fácil de defender en términos de modelo de negocio (ingresos por suscripción institucional, no publicidad ni donaciones) y el más cercano a sistemas exitosos del ecosistema universitario argentino como SIU Guaraní. Ampliar el alcance hacia un marketplace o portal público hubiera implicado un modelo de negocio completamente distinto, con complejidades regulatorias, de adquisición de usuarios y de monetización que exceden los objetivos del proyecto tal como fue concebido.

### Entregables del Proyecto

Business Model Canvas



WBS (Work Breakdown Structure)

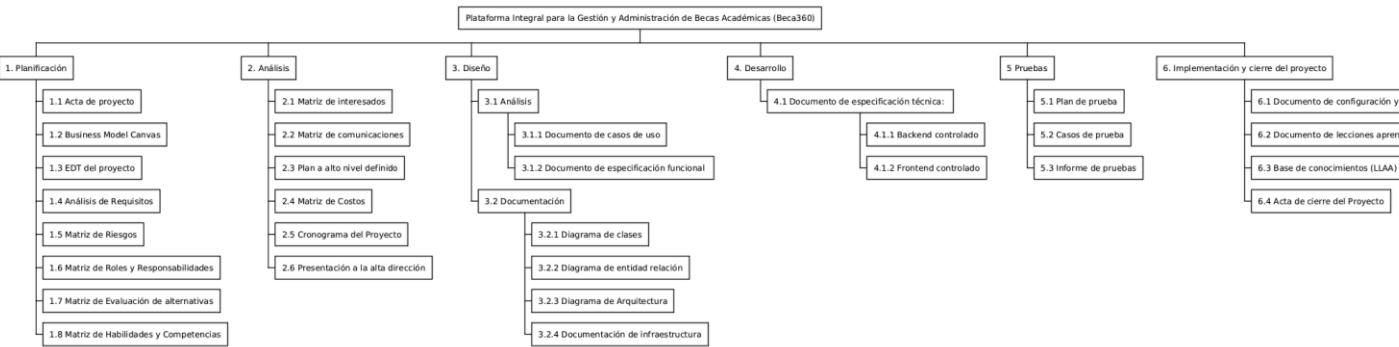

Matriz de Riesgos

|                                                                                             |                                                                                       |            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UTN.BA | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                             | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                             | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

| Id  | Descripción                                                                                | Fecha      | Contexto                                                                          | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Exposición (P x I) | Plan de Acción | Vigente |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------|----------------|---------|
| R1  | Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones               | 16/06/2026 | Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy                             | Media                      | Alto    | Alta               | P1             | Sí      |
| R2  | Baja adopción de la plataforma por parte de universidades                                  | 16/06/2026 | Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI                       | Media                      | Alto    | Alta               | P2             | Sí      |
| R3  | Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas                                   | 16/06/2026 | Diversidad de reglas entre instituciones                                          | Alta                       | Medio   | Alta               | P3             | Sí      |
| R4  | Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares) | 16/06/2026 | Cada universidad tiene infraestructura distinta                                   | Media                      | Alto    | Alta               | P4             | Sí      |
| R5  | Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes                            | 16/06/2026 | Manejo de datos personales y documentación académica                              | Media                      | Alto    | Alta               | P5             | Sí      |
| R6  | Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones                    | 16/06/2026 | Picos en convocatorias masivas                                                    | Media                      | Alto    | Alta               | P6             | Sí      |
| R7  | Retrasos en el cronograma del proyecto                                                     | 16/06/2026 | Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.)                    | Alta                       | Medio   | Alta               | P7             | Sí      |
| R8  | Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución              | 16/06/2026 | Cada institución define reglas distintas                                          | Alta                       | Alto    | Alta               | P8             | Sí      |
| R9  | Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep)                                | 16/06/2026 | Evolución del diseño conceptual en curso académico                                | Alta                       | Alto    | Alta               | P9             | Sí      |
| R10 | Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes                            | 16/06/2026 | Formularios de postulación sin validación estricta                                | Baja                       | Bajo    | Baja               | P10            | Sí      |
| R11 | Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales                          | 16/06/2026 | Cumplimiento de leyes de protección de datos                                      | Media                      | Alto    | Alta               | P11            | Sí      |
| R12 | Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP)                              | 16/06/2026 | Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión                       | Alta                       | Alto    | Alta               | P12            | Sí      |
| R13 | Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos                          | 16/06/2026 | Personal institucional con baja alfabetización digital                            | Media                      | Bajo    | Baja               | P13            | Sí      |
| R14 | Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in)                | 16/06/2026 | Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia | Baja                       | Medio   | Baja               | P14            | Sí      |
| R15 | Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo                         | 16/06/2026 | Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado                      | Baja                       | Alto    | Media              | P15            | Sí      |
| R16 | Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo                                      | 16/06/2026 | Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes          | Media                      | Alto    | Alta               | P16            | Sí      |
| R17 | Falta de documentación técnica y funcional del sistema                                     | 16/06/2026 | Desarrollo predefinido sin documentación definida                                 | Baja                       | Alta    | Media              | P17            | Sí      |
| R18 | Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales         | 16/06/2026 | Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores             | Baja                       | Alto    | Media              | P18            | Sí      |
| R19 | Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma             | 16/06/2026 | Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa                   | Media                      | Alto    | Alta               | P19            | Sí      |
| R20 | Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy                      | 16/06/2026 | Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel        | Baja                       | Alto    | Media              | P20            | Sí      |
| R21 | Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento                | 16/06/2026 | Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales          | Media                      | Baja    | Baja               | P21            | Sí      |

Planes de acción / contingencia



|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

| Id  | Estrategia    | Descripción de la Acción                                                                                                                                                                                                                                 | Disparadores del Plan                                                                                                                          | Responsable                                                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| P1  | Mitigar       | Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions) para facilitar la transición.                                                                | Feedback negativo de usuarios administrativos; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso.                                          | Líder de Proyecto / Responsable de Implementación           |
| P2  | Mitigar       | Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas.                                                                                                   | Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación.                                   | Responsable Comercial / Líder de Proyecto                   |
| P3  | Mitigar       | Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución.                                                     | Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas.                     | Analista Funcional / Líder de Proyecto                      |
| P4  | Mitigar       | Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración.                                                                            | Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento.                              | Arquitecto de Software / Equipo de Desarrollo               |
| P5  | Mitigar       | Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente).                                    | Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución.                           | Responsable de Seguridad Informática / Equipo de Desarrollo |
| P6  | Mitigar       | Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda.                                                                                         | Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa.                               | Arquitecto Cloud / Equipo de Infraestructura                |
| P7  | Mitigar       | Implementar metodología ágil con sprints cortos y revisiones semanales de avance. Incorporar buffer de tiempo en hitos críticos y establecer criterios de aceptación por entregable.                                                                     | Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico.                                             | Líder de Proyecto / Scrum Master                            |
| P8  | Mitigar       | Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración.                                               | Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad. | Analista Funcional / Líder de Producto                      |
| P9  | Evitar        | Establecer un proceso formal de control de cambios (formulario, análisis de impacto, aprobación). Definir y congelar el alcance del MVP para la primera versión. Diferir funcionalidades secundarias a releases posteriores.                             | Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado.                 | Líder de Proyecto / Sponsor del Proyecto                    |
| P10 | Mitigar       | Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante.                                                                    | Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario.              | Equipo de Desarrollo / Diseñador UX                         |
| P11 | Mitigar       | Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales).  | Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución.                              | Asesor Legal / Líder de Proyecto                            |
| P12 | Evitar        | Definir y documentar el alcance mínimo del MVP priorizando funcionalidades core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental y reportes básicos. Diferir funcionalidades secundarias a versiones futuras mediante backlog priorizado. | Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema.             | Líder de Proyecto / Product Owner                           |
| P13 | No considerar | Incorporar principios de diseño UX centrado en el usuario no técnico. Realizar pruebas de usabilidad con perfiles administrativos reales. Proveer tutoriales, guías rápidas y soporte de onboarding institucional.                                       | Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso.                | Diseñador UX / Responsable de Capacitación                  |
| P14 | Mitigar       | Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud.                                                      | Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor.                      | Arquitecto de Software / Líder de Infraestructura           |
| P15 | Mitigar       | Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica).                                           | Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada.                               | Líder de Proyecto / Patrocinador del Proyecto               |
| P16 | Mitigar       | Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico desde el inicio. Implementar revisiones de código entre pares y distribuir responsabilidades técnicas entre al menos dos miembros del equipo.                                     | Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona.              | Líder de Proyecto / Líder Técnico                           |
| P17 | Mitigar       | Establecer estándares de documentación como parte de la definición de hecho (DoD) en cada sprint. Utilizar herramientas colaborativas (Confluence, Wiki) y asignar un responsable de documentación por módulo.                                           | Documentación ausente o desactualizada al cierre de un sprint; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible.                 | Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo                    |
| P18 | Mitigar       | Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes. Comparar resultados con fuentes de datos primarias antes del lanzamiento y en cada actualización del módulo.                                                          | Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos.           | Analista de Datos / Equipo de QA                            |



|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                    |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P19 | Transferir / Mitigar | Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones.              | Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante periodo de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico. | Responsable de Infraestructura / Líder de Proyecto |
| P20 | Mitigar              | Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción. | Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%.                                     | Arquitecto de Datos / Líder Técnico                |
| P21 | Mitigar              | Planificar sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con representantes de instituciones piloto (administrativos y estudiantes). Incorporar el feedback obtenido en las últimas iteraciones previas al lanzamiento.       | UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución.                     | Líder de Proyecto / Responsable de QA              |

### 3. Criterios

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Leyenda</b>    | Nivel de exposición                       |
| <b>Importante</b> | Requiere Plan de Acción inmediato         |
| <b>Moderado</b>   | Monitorear y evaluar acciones preventivas |
| <b>Tolerable</b>  | Aceptar y registrar                       |

### 4. Estrategias

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leyenda</b>    | Estrategias de Respuesta al Riesgo                                             |
| <b>Mitigar</b>    | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.                             |
| <b>Evitar</b>     | Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.             |
| <b>Transferir</b> | Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).           |
| <b>Aceptar</b>    | Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva). |

Matriz de Evaluación

|                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|
| Decisión:                   | Selección de la estrategia de desarrollo de la plataforma Beca360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
| Opción 1:                   | Desarrollo a medida con equipo propio                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
| Opción 2:                   | Adaptación de plataforma open-source existente                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
| Opción 3:                   | Plataforma Low-Code / SaaS de terceros                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
|                             |                                                                   | Opción 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |       | Opción 2                                                                                                                                                                                                               |  |            |       | Opción 3                                                                                                                                                                                                       |  |            |       |
|                             |                                                                   | Desarrollo a medida con equipo propio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            | BIEN  | Adaptación de plataforma open-source existente                                                                                                                                                                         |  |            | BIEN  | Plataforma Low-Code / SaaS de terceros                                                                                                                                                                         |  |            | BIEN  |
| CRITERIOS                   | Peso                                                              | Comentarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Puntuación | Valor | Comentarios                                                                                                                                                                                                            |  | Puntuación | Valor | Comentarios                                                                                                                                                                                                    |  | Puntuación | Valor |
| ♦Técnico                    | 35                                                                | Arquitectura personalizada con máxima flexibilidad para implementar reglas de evaluación configurables por institución e integración nativa con sistemas como SIU Guaraní. Permite diseño cloud-native desde el inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 8          | 280   | La base open-source provee un punto de partida funcional, aunque las personalizaciones avanzadas (motor de reglas, APIs propias) pueden estar limitadas o encarecerse según la arquitectura base del proyecto elegido. |  | 6          | 210   | Limitaciones significativas para implementar lógica de negocio compleja. La dependencia del vendor restringe la configuración de criterios institucionales y las integraciones con sistemas académicos legacy. |  | 4          | 140   |
| ♦Económico                  | 20                                                                | Mayor inversión inicial en RRHH especializados (arquitecto, desarrolladores senior, QA). Sin costos de licencias externas, pero el TCO a corto plazo es el más elevado del análisis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5          | 100   | Eliminación de costos de licencias comerciales. La inversión se concentra en adaptación y mantenimiento del fork, con buena relación costo-beneficio a mediano plazo.                                                  |  | 8          | 160   | Menor costo de desarrollo inicial, pero los costos recurrentes de licenciamiento y el riesgo de vendor lock-in elevan el TCO total a mediano y largo plazo.                                                    |  | 7          | 140   |
| ♦Plazo                      | 15                                                                | Requiere el mayor tiempo de desarrollo para alcanzar el MVP. Toda la arquitectura y funcionalidades se construyen desde cero, lo que implica mayor esfuerzo en diseño, construcción y testing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5          | 75    | La plataforma base existente acelera el desarrollo inicial. El plazo final depende de la brecha entre las funcionalidades disponibles y los requisitos específicos de Beca360.                                         |  | 7          | 105   | Menor tiempo para obtener una versión funcional inicial. Ideal para validación rápida del concepto, aunque las personalizaciones avanzadas pueden extender el plazo en etapas posteriores.                     |  | 9          | 135   |
| ♦Escalabilidad              | 20                                                                | Diseño cloud-native propio (microservicios, auto-scaling) permite optimizar la escalabilidad para absorber picos de postulaciones en convocatorias masivas y crecer hacia múltiples instituciones contratantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 9          | 180   | La escalabilidad depende de la arquitectura de la plataforma base. Puede requerir refactorizaciones significativas si el diseño original no contempla carga institucional masiva.                                      |  | 6          | 120   | Escalabilidad restringida por los límites impuestos por el proveedor. Dificultad para soportar alto volumen de postulaciones simultáneas entre múltiples instituciones.                                        |  | 4          | 80    |
| TOTAL                       |                                                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 715        |       |                                                                                                                                                                                                                        |  | 655        |       |                                                                                                                                                                                                                |  | 545        |       |
| Detalle de las alternativas |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
| Alternativa 1:              |                                                                   | Alternativa 1 — Desarrollo a medida con equipo propio (715 pts): es la alternativa recomendada y elegida. El mayor control sobre la arquitectura técnica, la capacidad de implementar reglas de evaluación configurables por institución y la escalabilidad cloud-native son los factores determinantes para el modelo SaaS institucional de Beca360. Si bien implica una mayor inversión inicial y un plazo de desarrollo más extenso, estos atributos son esenciales para sostener el crecimiento hacia múltiples organizaciones y garantizar la protección de datos sensibles de estudiantes con cumplimiento normativo local. |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
| Alternativa 2:              |                                                                   | Alternativa 2 — Adaptación de plataforma open-source (655 pts): Representa una alternativa viable a mediano plazo. La adaptación de una plataforma open-source reduce los costos de licenciamiento y acelera el desarrollo inicial, pero las restricciones en personalización avanzada del motor de reglas institucionales y la dependencia de la comunidad para actualizaciones de seguridad representan riesgos relevantes para una plataforma que gestiona datos sensibles de estudiantes. Se recomienda evaluar como alternativa secundaria si los recursos disponibles para la Alternativa 1 resultan insuficientes.         |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
| Alternativa 3:              |                                                                   | Alternativa 3 — Plataforma Low-Code / SaaS de terceros (545 pts): Es la alternativa con menor puntaje. Si bien ofrece el menor tiempo de implementación y un costo de desarrollo inicial reducido, las restricciones técnicas para implementar lógica compleja de evaluación de becas, las limitaciones de escalabilidad ante convocatorias masivas y la alta dependencia del vendor no son compatibles con los objetivos estratégicos de Beca360 como plataforma SaaS institucional robusta. No se recomienda esta alternativa para el alcance definido en el proyecto.                                                          |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |
| Alternativa 3:              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                        |  |            |       |                                                                                                                                                                                                                |  |            |       |

Matriz de roles y responsabilidades

| BECA360 — Matriz de Roles y Responsabilidades                                                    |                                                    |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|
| Plataforma SaaS Institucional para Gestión de Becas Académicas   Versión 1.0   Fecha: 07/07/2026 |                                                    |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |
| Entregables                                                                                      | LP                                                 | PO     | AF          | ARQ    | BE          | FE          | UX          | QA          | DBA         | SEC    | SPO       |
|                                                                                                  | Senior                                             | Senior | Semi-Senior | Senior | Semi-Senior | Semi-Senior | Semi-Senior | Semi-Senior | Semi-Senior | Senior | Directivo |
| D01 — Acta de Constitución del Proyecto                                                          | E                                                  | A      | P           | I      |             |             |             |             |             | I      | F         |
| D02 — Documento de Requisitos Funcionales                                                        | C                                                  | A      | E           | P      | I           | I           | P           | I           | I           | I      | F         |
| D03 — Diseño de Arquitectura de Software                                                         | C                                                  | I      | I           | E      | P           | P           |             | I           | P           | P      | A         |
| D04 — Prototipo / Wireframes de la Plataforma                                                    | C                                                  | A      | P           | I      |             | P           | E           |             |             |        | I         |
| D05 — Módulo de Gestión de Convocatorias                                                         | C                                                  | A      | I           | C      | E           | P           | I           | P           | P           | I      |           |
| D06 — Módulo de Gestión de Postulaciones                                                         | C                                                  | A      | I           | C      | E           | P           | I           | P           | P           | I      |           |
| D07 — Módulo de Validación Documental                                                            | C                                                  | A      | P           | I      | E           | I           | I           | P           | P           | P      |           |
| D08 — Módulo de Evaluación y Asignación de Becas                                                 | C                                                  | A      | P           | I      | E           | P           | I           | P           | P           | I      |           |
| D09 — Módulo de Reportes e Indicadores                                                           | C                                                  | A      | P           | I      | E           | P           | P           | P           | P           |        |           |
| D10 — Plan de Pruebas y Resultados (QA)                                                          | C                                                  | A      | I           | I      | P           | P           |             | E           | I           | P      | F         |
| D11 — Documentación Técnica y Manual de Usuario                                                  | C                                                  | A      | P           | P      | P           | P           | P           | I           | P           | I      | F         |
| D12 — Plan de Implementación y Capacitación                                                      | E                                                  | A      | P           | I      | I           |             | P           | I           | I           | P      | F         |
| LEYENDA — Códigos de Participación                                                               |                                                    |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |
| E                                                                                                | Elabora — es responsable de crear el entregable    |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |
| A                                                                                                | Aprueba — da la aprobación del usuario/interesado  |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |
| C                                                                                                | Controla — realiza QA del documento/entregable     |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |
| I                                                                                                | Es Consultado — provee información y es consultado |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |
| P                                                                                                | Participa — colabora en la elaboración             |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |
| F                                                                                                | Firma — otorga la aprobación formal institucional  |        |             |        |             |             |             |             |             |        |           |

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

| BECA360 — Perfiles, Competencias y Responsabilidades por Rol |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Plataforma SaaS Institucional   Versión 1.0   07/07/2026     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Rol                                                          | Seniority             | Habilidades Técnicas                                                                                                                                                                                                                                                      | Competencias Transversales                                                                                                                                                                             | Responsabilidades en el Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cantidad Estimada |
| Lider de Proyecto                                            | Senior (5+ años)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMBOK / metodologías ágiles (Scrum/Kanban)</li> <li>• Gestión de riesgos y cronograma</li> <li>• MS Project / Jira</li> <li>• Presupuestación y control de costos</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liderazgo y toma de decisiones</li> <li>• Comunicación efectiva con stakeholders</li> <li>• Gestión del cambio</li> <li>• Resolución de conflictos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificar y controlar el alcance, tiempo y costo</li> <li>• Gestionar riesgos y planes de acción</li> <li>• Coordinar al equipo multidisciplinario</li> <li>• Reportar avances al Sponsor</li> <li>• Elaborar acta de constitución y plan de proyecto</li> </ul>                                                               | 1                 |
| Product Owner                                                | Senior (5+ años)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Product Management</li> <li>• Definición y priorización de backlog</li> <li>• Gestión de stakeholders institucionales</li> <li>• Conocimiento del dominio de becas académicas</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visión de producto</li> <li>• Negociación y consenso</li> <li>• Orientación al cliente institucional</li> <li>• Pensamiento estratégico</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir y priorizar el backlog del producto</li> <li>• Representar a las instituciones clientes</li> <li>• Validar entregables funcionales con usuarios</li> <li>• Aprobar requisitos y prototipos</li> <li>• Gestionar expectativas de los interesados</li> </ul>                                                              | 1                 |
| Analista Funcional                                           | Semi-Senior (3+ años) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevamiento y documentación de requisitos</li> <li>• Modelado de procesos (BPMN)</li> <li>• Casos de uso y User Stories</li> <li>• Conocimiento de sistemas universitarios</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensamiento analítico</li> <li>• Escucha activa y empatía</li> <li>• Capacidad de síntesis</li> <li>• Trabajo en equipo</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevar y documentar requisitos funcionales</li> <li>• Elaborar especificaciones funcionales detalladas</li> <li>• Analizar procesos actuales de gestión de becas</li> <li>• Actuar como nexo entre negocio y equipo técnico</li> <li>• Verificar que el sistema cumpla los requisitos</li> </ul>                               | 1                 |
| Arquitecto de Software                                       | Senior (6+ años)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseño de arquitecturas cloud-native</li> <li>• Microservicios y APIs RESTful</li> <li>• AWS / GCP / Azure</li> <li>• Contenedores (Docker, Kubernetes)</li> <li>• Patrones de diseño y buenas prácticas</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visión técnica de largo plazo</li> <li>• Liderazgo técnico</li> <li>• Capacidad de abstracción</li> <li>• Comunicación técnica clara</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar la arquitectura global de la plataforma</li> <li>• Definir estándares técnicos y guías de desarrollo</li> <li>• Validar decisiones técnicas del equipo</li> <li>• Asegurar escalabilidad y disponibilidad del sistema</li> <li>• Liderar la integración con sistemas externos (SIU Guarani)</li> </ul>                  | 1                 |
| Desarrollador Backend                                        | Semi-Senior (3+ años) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Java / Python / Node.js</li> <li>• Diseño de APIs REST / GraphQL</li> <li>• Bases de datos relacionales (PostgreSQL)</li> <li>• Seguridad en APIs (OAuth 2.0, JWT)</li> <li>• Pruebas unitarias e integración</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atención al detalle</li> <li>• Trabajo colaborativo (Git)</li> <li>• Autodidacta</li> <li>• Responsabilidad y proactividad</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar los módulos y APIs del backend</li> <li>• Implementar la lógica de negocio configurable por institución</li> <li>• Integrar con sistemas académicos externos</li> <li>• Documentar el código y las APIs desarrolladas</li> <li>• Participar en revisiones de código (code reviews)</li> </ul>                       | 2                 |
| Desarrollador Frontend                                       | Semi-Senior (3+ años) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• React.js / Angular</li> <li>• HTML5, CSS3, TypeScript</li> <li>• Consumo de APIs REST</li> <li>• Diseño responsivo / accesibilidad</li> <li>• Herramientas de testing frontend</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientación al usuario</li> <li>• Creatividad técnica</li> <li>• Comunicación con diseñador UX</li> <li>• Trabajo colaborativo</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar la interfaz web de la plataforma</li> <li>• Implementar prototipos y wireframes aprobados</li> <li>• Garantizar compatibilidad cross-browser</li> <li>• Optimizar rendimiento y accesibilidad del frontend</li> <li>• Participar en pruebas de usabilidad</li> </ul>                                                | 1-2               |
| Administrador de BD (DBA)                                    | Semi-Senior (3+ años) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PostgreSQL / MySQL</li> <li>• Diseño y modelado de bases de datos</li> <li>• Optimización de consultas y performance</li> <li>• Políticas de backup y recuperación</li> <li>• Seguridad y cifrado de datos en reposo</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meticulosidad</li> <li>• Orientación al dato</li> <li>• Trabajo colaborativo</li> <li>• Proactividad en optimización</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el modelo de datos de la plataforma</li> <li>• Implementar y mantener la base de datos</li> <li>• Garantizar integridad, performance y disponibilidad de los datos</li> <li>• Definir políticas de backup y recovery</li> <li>• Colaborar en migraciones de datos desde sistemas legacy</li> </ul>                      | 1                 |
| Responsable de Seguridad                                     | Senior (5+ años)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciberseguridad aplicada a SaaS</li> <li>• ISO 27001 / OWASP</li> <li>• Cifrado y protección de datos personales</li> <li>• Análisis de vulnerabilidades (pentesting)</li> <li>• Normativas de privacidad (Ley 25.326)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensamiento crítico y preventivo</li> <li>• Proactividad ante riesgos</li> <li>• Comunicación clara de riesgos</li> <li>• Actualización permanente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir la arquitectura de seguridad de la plataforma</li> <li>• Realizar auditorías y pruebas de penetración</li> <li>• Asegurar cumplimiento con Ley 25.326 y normativas vigentes</li> <li>• Implementar políticas de cifrado y control de accesos</li> <li>• Capacitar al equipo en buenas prácticas de seguridad</li> </ul> | 1                 |
| Sponsor / Comité Directivo                                   | Directivo / Ejecutivo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento institucional y del negocio</li> <li>• Gestión de presupuesto</li> <li>• Alineación estratégica organizacional</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liderazgo organizacional</li> <li>• Visión estratégica</li> <li>• Toma de decisiones ejecutivas</li> <li>• Gestión de relaciones institucionales</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveer el financiamiento y los recursos del proyecto</li> <li>• Aprobar el alcance y los cambios estratégicos</li> <li>• Firmar formalmente los entregables clave</li> <li>• Resolver escalamientos y conflictos de alto nivel</li> <li>• Garantizar el alineamiento del proyecto con la estrategia institucional</li> </ul>   | 1-3               |

Matriz de comunicaciones

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | <b>K4053</b>                                                                          |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

| Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto                                      |                                            |                             |                              |                                       |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Mensaje                                                                              | Audiencia / Destinatario                   | Método / Medio              | Frecuencia                   | Remitente del Mensaje                 | Tipo de Comunicación    |
| Informe de Avance Semanal (estado del proyecto: avance, riesgos, próximos hitos)     | Sponsor / Comité Directivo                 | E-mail                      | Semanal                      | Líder de Proyecto                     | Formal – Escrito        |
| Acta de Reunión (registro de decisiones, compromisos y responsables)                 | Todos los participantes de cada reunión    | E-mail                      | Post cada reunión            | Responsable de Minuta (según reunión) | Formal – Escrito        |
| Reporte de Estado de Sprint (avance del sprint, demostraciones de funcionalidades)   | Sponsor + PO + Equipo + Stakeholders clave | Presentación Oral + Escrito | Quincenal (cierre de sprint) | Líder de Proyecto / Product Owner     | Formal – Oral y Escrito |
| Alerta de Riesgo (notificación de riesgo materializado o con alta probabilidad)      | Sponsor / Comité Directivo                 | E-mail / Reunión urgente    | Por necesidad                | Líder de Proyecto                     | Formal – Escrito        |
| Comunicado de Hito / Entregable (aprobación y cierre de fase o entregable clave)     | Instituciones piloto + Sponsor + Comité    | Presentación + E-mail       | Por evento / hito            | Líder de Proyecto + Product Owner     | Formal – Escrito y Oral |
| Reporte de QA y Defectos (resultados de pruebas, defectos abiertos y cerrados)       | Líder de Proyecto + Product Owner          | Jira / E-mail               | Al cierre de cada sprint     | Responsable de QA                     | Formal – Escrito        |
| Convocatoria y Agenda de Reunión (notificación anticipada con temario de la reunión) | Participantes de cada reunión              | E-mail / Calendario         | 48 hs previas a cada reunión | Líder de Proyecto                     | Informal – Escrito      |


| Reuniones acordadas del Proyecto       |                                       |                       |                                                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Reunión                        | Frecuencia                            | Responsable de Minuta | Integrantes                                                                              |
| Reunión de Kick-off                    | Una vez (inicio del proyecto)         | Líder de Proyecto     | Equipo completo (LP, PO, AF, ARQ, BE, FE, UX, QA, DBA, SEC) + Sponsor + Comité Directivo |
| Standup / Seguimiento diario de equipo | Diaria (15 min)                       | Líder de Proyecto     | Equipo de desarrollo: BE, FE, ARQ, QA, DBA, UX + LP                                      |
| Sprint Review (Revisión de Sprint)     | Quincenal (cierre de sprint)          | Product Owner         | Equipo completo + Sponsor + representantes institucionales (institución piloto)          |
| Sprint Retrospective                   | Quincenal (post Sprint Review)        | Líder de Proyecto     | Equipo de desarrollo (LP, ARQ, BE, FE, UX, QA, DBA, SEC)                                 |
| Reunión de Comité de Dirección         | Mensual                               | Líder de Proyecto     | Sponsor, LP, PO, Responsable de Seguridad                                                |
| Reunión de Relevamiento de Requisitos  | Por necesidad (fase de planificación) | Analista Funcional    | AF, PO + representantes de instituciones piloto (Coord. de Becas, Dir. TI)               |
| Reunión de Cierre de Fase / Hito       | Por hito (6 a lo largo del proyecto)  | Líder de Proyecto     | Equipo completo + Sponsor + Comité Directivo                                             |

Matriz de interesados


| Matriz de Identificación de los Interesados del Proyecto |                                             |                                         |                         |                                                                                       |                     |                                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre y Apellido                                        | Cargo o Posición                            | Rol en el Proyecto                      | Información de Contacto | Requerimientos                                                                        | Nivel de Influencia | Expectativas del Proyecto                                                            | Clasificación           |
| Comité Directivo / Sponsor                               | Director Ejecutivo / Comité de Dirección    | Patrocinador del Proyecto               | —                       | Retorno de inversión, cumplimiento de plazos y alcance aprobado                       | Muy Alto            | Producto escalable y rentable; ingresos sostenidos por suscripciones institucionales | Muy Influyente          |
| Rector / Decano Institución Cliente                      | Autoridad máxima de la institución          | Sponsor Institucional (cliente pagador) | —                       | Plataforma confiable, reducción de carga administrativa                               | Muy Alto            | Modernizar gestión de becas; mejorar imagen institucional frente a postulantes       | Muy Influyente          |
| Director/a de TI Institución Cliente                     | Responsable tecnológico de la institución   | Decisor Técnico (cliente)               | —                       | Integración con SIU Guaraní, seguridad de datos, SLAs de disponibilidad               | Alto                | Implementación sin interrupciones en sistemas existentes                             | Muy Influyente          |
| Coordinador/a de Becas                                   | Responsable operativo del programa de becas | Usuario Clave / Administrador           | —                       | Interfaz simple, flujos claros, soporte y capacitación adecuados                      | Alto                | Digitalizar procesos manuales; reducir tiempos de gestión y errores operativos       | Muy Influyente          |
| Líder de Proyecto                                        | Project Manager (interno Beca360)           | Responsable de Gestión                  | —                       | Equipo estable, requisitos claros, decisiones ejecutivas ágiles, presupuesto aprobado | Alto                | Entregar el proyecto en tiempo, costo y calidad acordados                            | Muy Influyente          |
| Equipo de Desarrollo                                     | ARQ, BE, FE, UX, QA, DBA, SEC               | Ejecutores del Proyecto                 | —                       | Requisitos estables, herramientas adecuadas, decisiones técnicas ágiles               | Alto                | Desarrollar un producto técnicamente sólido; crecimiento profesional                 | Influyente              |
| Estudiantes Postulantes                                  | Usuario final de la plataforma              | Usuario Final (no pagador)              | —                       | Proceso de postulación simple, transparente y accesible                               | Bajo                | Acceder a becas fácilmente; seguimiento claro del estado de su postulación           | Medianamente Influyente |
| Ministerio de Educación / Organismos                     | Ente regulador educativo y de datos         | Regulador Externo                       | —                       | Cumplimiento de normativas educativas y Ley 25.326 de datos personales                | Medio               | Garantizar transparencia y legalidad en gestión de becas académicas                  | Medianamente Influyente |
| Proveedor Cloud (AWS / GCP / Azure)                      | Empresa proveedora de infraestructura       | Proveedor de Infraestructura            | —                       | Cumplimiento de contratos, pago puntual, especificaciones técnicas claras             | Medio               | Continuidad del contrato de servicio y crecimiento de consumo                        | Poco Influyente         |
| Analista Funcional                                       | Profesional interno Beca360                 | Nexo Negocio-Tecnología                 | —                       | Acceso fluido a referentes institucionales; requisitos validados oportunamente        | Alto                | Documentar requisitos completos y validados; contribuir al éxito funcional           | Influyente              |

| Estrategia para la Gestión de los Interesados |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre y Apellido                             | Nivel de Influencia | Análisis de Impacto                                                                                                                        | Estrategia                                                                                                                                               |
| Comité Directivo / Sponsor                    | Muy Alto            | Org.: muy alto. Operativo: alto. Técnico: bajo.<br>Decide presupuesto, alcance estratégico y continuidad del proyecto.                     | Reuniones mensuales de Comité. Reportes ejecutivos de avance quincenales. Participación formal en hitos de aprobación y firma de entregables clave.      |
| Rector / Decano Institución Cliente           | Muy Alto            | Org.: muy alto. Operativo: alto. Técnico: bajo.<br>Su respaldo institucional es clave para la adopción interna.                            | Presentaciones ejecutivas en hitos clave. Demostraciones del valor generado (reducción de tiempos, transparencia). Comunicación vía LP y PO.             |
| Director/a de TI Institución Cliente          | Alto                | Técnico: muy alto. Operativo: alto.<br>Validará integraciones y decidirá la habilitación de accesos a sistemas internos.                   | Reuniones técnicas con Arquitecto de SW. Demos de integración con SIU Guaraní. Documentación técnica y de seguridad detallada.                           |
| Coordinador/a de Becas                        | Alto                | Operativo: muy alto.<br>Es el usuario más frecuente; su aceptación determina el éxito operativo de la plataforma.                          | Participación activa en UAT y workshops de relevamiento. Capacitaciones presenciales/virtuales. Canal directo con el equipo de soporte.                  |
| Líder de Proyecto                             | Alto                | Técnico: alto. Operativo: muy alto. Org.: alto.<br>Coordina todos los frentes; su gestión impacta directamente en tiempo, costo y calidad. | Control permanente de cronograma y riesgos. Reuniones diarias de equipo. Reporte semanal al Sponsor. Gestión activa del plan de cambios.                 |
| Equipo de Desarrollo                          | Alto                | Técnico: muy alto. Operativo: muy alto.<br>Su rendimiento y motivación determinan la calidad y el plazo del producto.                      | Metodología ágil (sprints, retrospectivas). Code reviews y documentación continua. Ambiente colaborativo y decisiones técnicas ágiles.                   |
| Estudiantes Postulantes                       | Bajo                | Operativo: alto (son los usuarios finales del sistema).<br>Su experiencia define la percepción del producto hacia las instituciones.       | Pruebas de usabilidad en fases de diseño y UAT. Encuestas de satisfacción post-lanzamiento. Comunicación vía las propias instituciones.                  |
| Ministerio / Organismos reguladores           | Medio               | Legal: muy alto. Org.: alto.<br>Cambios normativos pueden impactar el diseño del sistema y los flujos de datos.                            | Monitoreo permanente de cambios en Ley 25.326 y normativas afines. Asesoría legal proactiva. Cumplimiento documentado y auditable.                       |
| Proveedor Cloud                               | Medio               | Técnico: muy alto.<br>Fallas en el servicio cloud impactan directamente la disponibilidad de la plataforma.                                | Revisión y negociación de SLAs. Plan de contingencia ante fallas (failover). Evaluación de alternativas cloud para evitar vendor lock-in.                |
| Analista Funcional                            | Alto                | Técnico: alto. Operativo: muy alto.<br>Definición correcta de requisitos es crítica para evitar retrabajo y scope creep.                   | Participación en todas las reuniones de relevamiento. Validación iterativa de especificaciones con el PO. Documentación formal con control de versiones. |

Cronograma Gaant

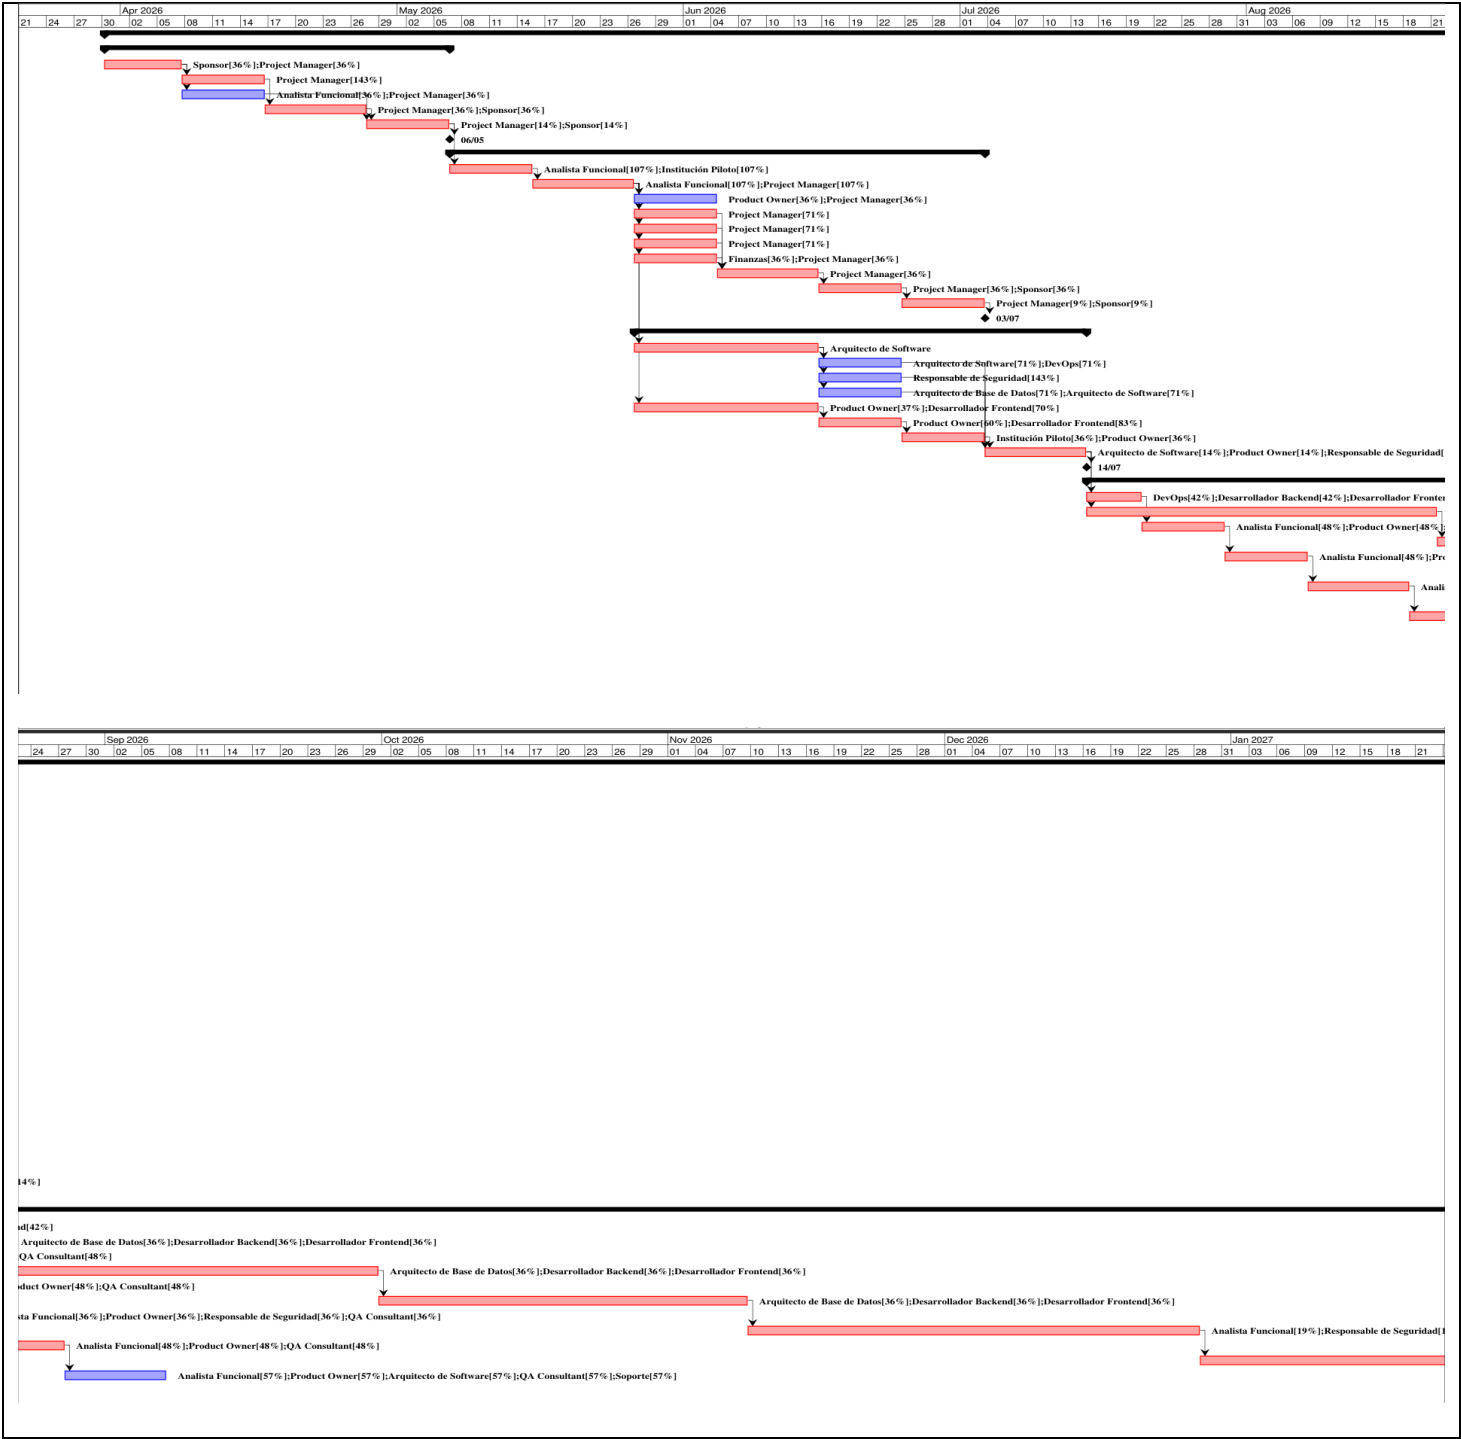




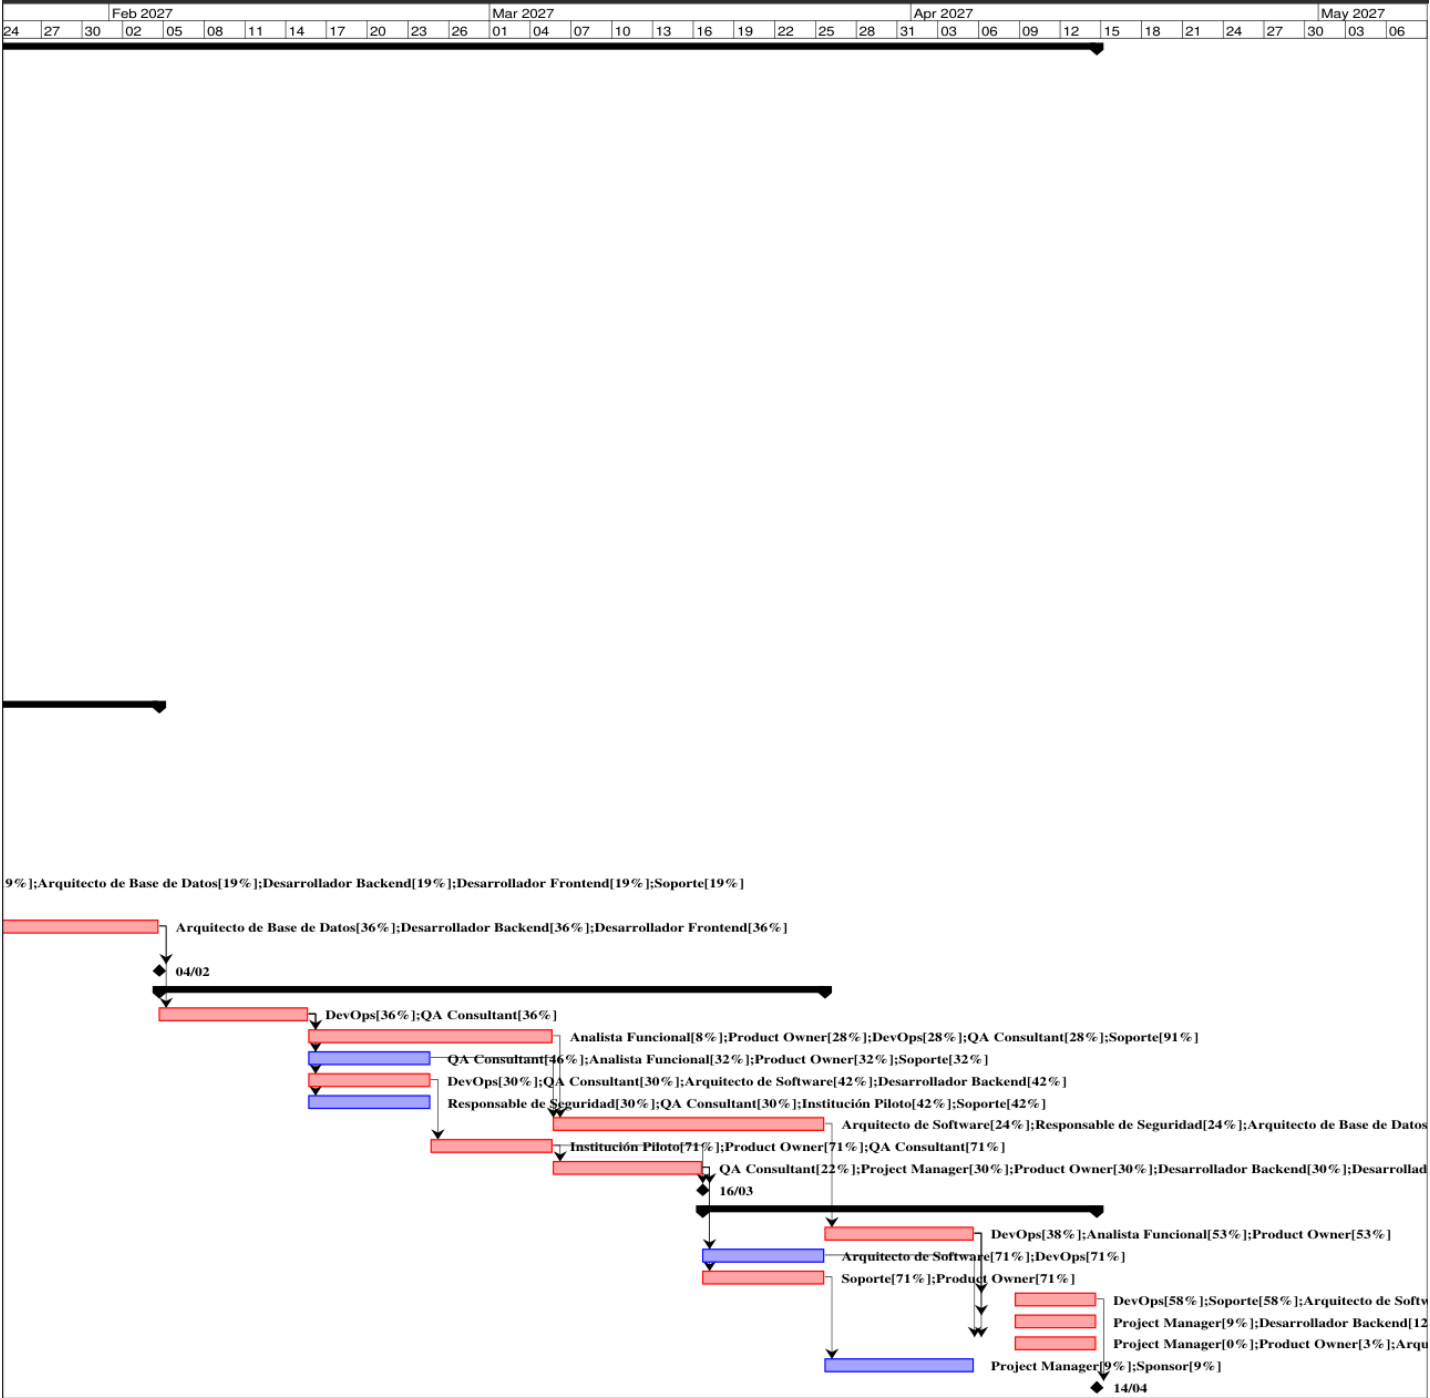

Organización del Proyecto

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | <b>K4053</b>                                                                          |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

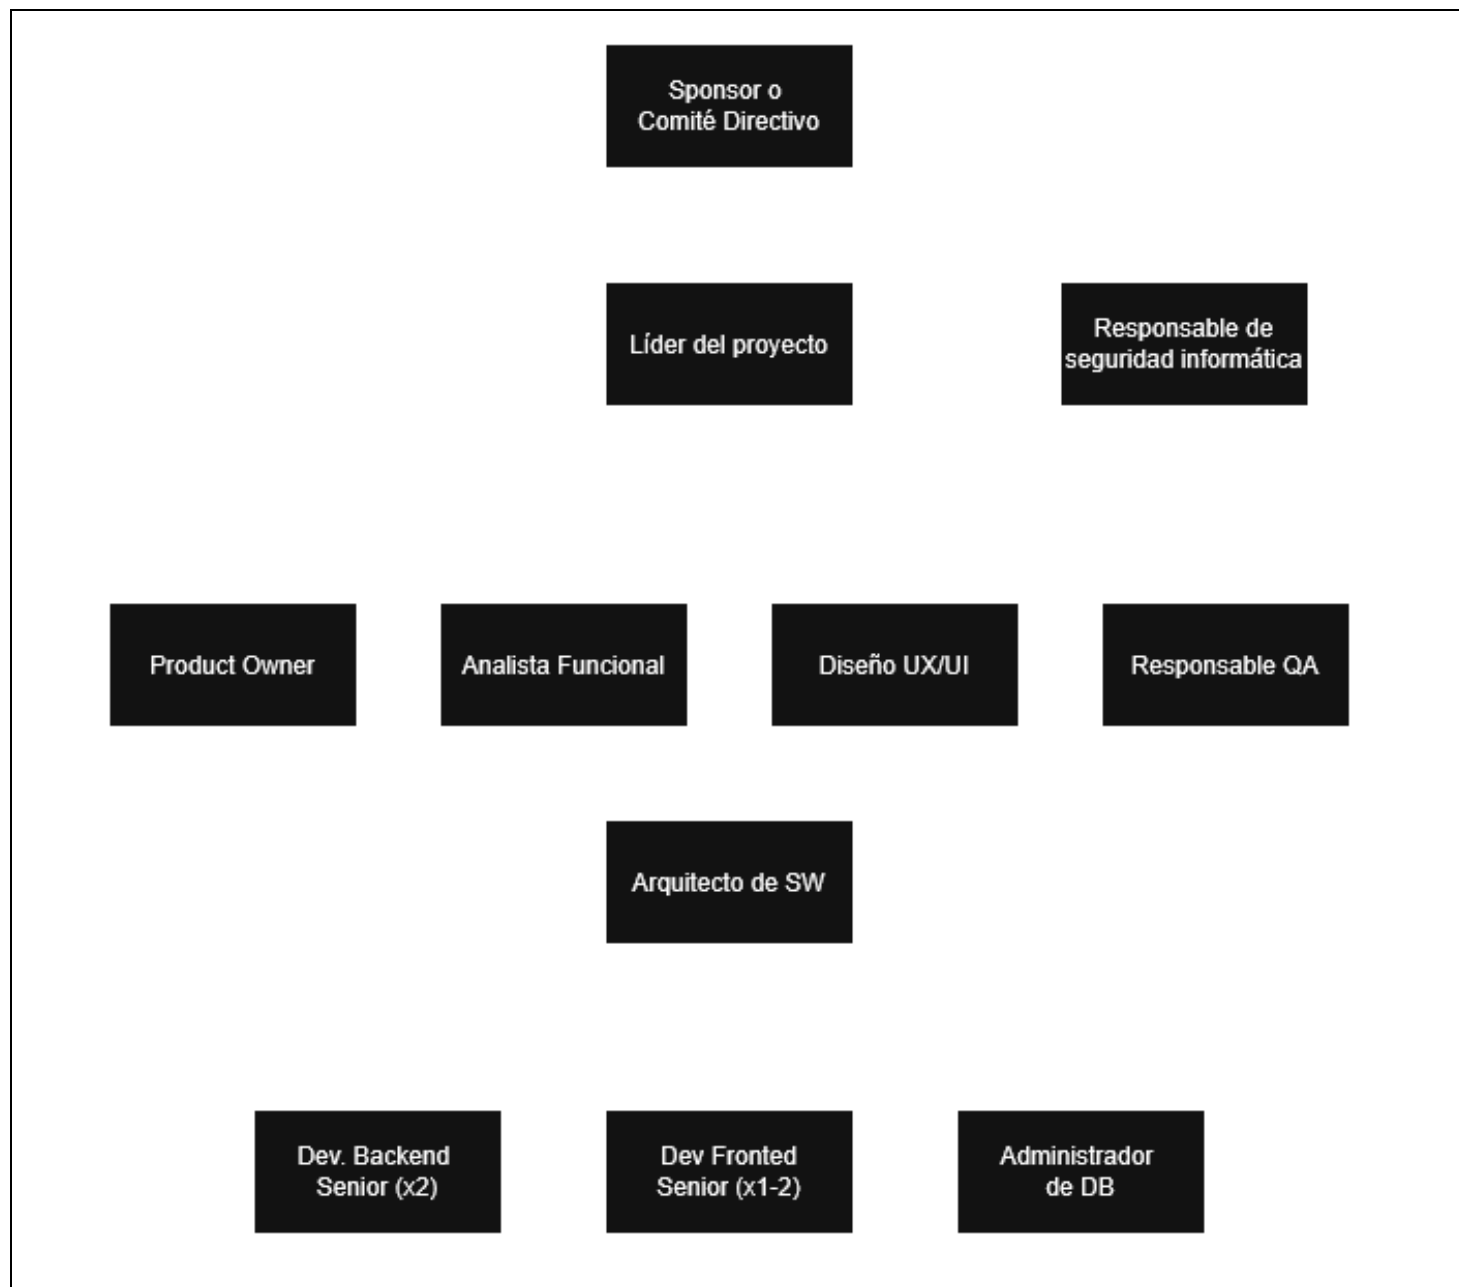

### Autoridad y Responsabilidad del Project Manager

**Ámbito de autoridad.** El Líder de Proyecto tiene autoridad plena sobre la gestión operativa del proyecto: planificación, asignación de tareas al equipo, control del cronograma y del presupuesto operativo dentro del monto aprobado. Puede aprobar cambios menores de alcance que no impacten el presupuesto ni las fechas de hitos clave. Ante cualquier cambio que afecte el alcance estratégico, el costo total o los entregables del MVP, debe elevar la decisión al Sponsor o Comité Directivo. No tiene autoridad para contratar recursos externos fuera del equipo aprobado ni para modificar unilateralmente el alcance del producto sin validación del Product Owner.

**Responsabilidades principales.** Es responsable de elaborar y mantener actualizado el plan del proyecto, la matriz de riesgos, el cronograma y el plan de comunicaciones. Coordina al equipo multidisciplinario

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

garantizando que cada rol cumpla su función según la matriz de responsabilidades. Controla la calidad de todos los entregables del proyecto (rol C en la matriz). Gestiona la relación con el Sponsor y reporta el avance del proyecto con métricas de alcance, tiempo y costo. Conduce las reuniones de seguimiento y asegura que los riesgos identificados tengan planes de acción activos y monitoreados. Es el punto de escalamiento interno ante conflictos o bloqueos del equipo, y el nexo entre el equipo técnico y los interesados institucionales.

### Enfoque de Implementación del Proyecto

El proyecto se maneja con un modelo predictivo. Desde el inicio se define todo el plan y el alcance del MVP queda congelado antes de arrancar el desarrollo, lo que significa que no se incorporan cambios funcionales durante la ejecución salvo casos excepcionales muy puntuales como una vulnerabilidad de seguridad crítica o un cambio normativo obligatorio.

La conducción del proyecto está a cargo del Líder de Proyecto, que trabaja en conjunto con el Product Owner para las decisiones del día a día. Cualquier cosa que afecte presupuesto, plazos o alcance tiene que pasar por el Comité Directivo. El seguimiento se hace con standups diarios del equipo, revisiones quincenales de avance y reuniones mensuales con el Comité. El avance se mide siempre contra las líneas base aprobadas al inicio.

### Enfoque de Implementación del Producto (Puesta en marcha)

El lanzamiento se hace en dos etapas.

Primero una **beta cerrada** con la institución piloto: una vez que el QA interno y las pruebas de carga y seguridad están aprobadas, el sistema se despliega en un ambiente productivo pero de acceso restringido. Solo acceden el personal administrativo de la institución piloto y un grupo pequeño de estudiantes seleccionados. No es un lanzamiento público, no hay comunicación externa ni acceso para otras instituciones. La idea es validar el ciclo completo: convocatoria, postulación, evaluación y asignación; en condiciones reales antes de salir definitivamente, y ajustar lo que haga falta dentro del alcance definido.

Una vez aprobado el UAT y cerrados los defectos relevantes, se pasa al **lanzamiento en producción**. Se despliega sobre infraestructura cloud con auto-scaling. Antes del go-live se capacita al personal administrativo de la institución piloto en el uso del sistema y los canales de soporte.

Las primeras dos semanas post-lanzamiento el equipo técnico mantiene monitoreo intensivo. Cuando el sistema está estable, se avanza con la oferta comercial hacia nuevas instituciones.

### Plan a Alto Nivel

El proyecto Beca360 se desarrollará bajo un enfoque predictivo, estableciendo de manera anticipada el alcance, los principales entregables, las líneas base de tiempo y costo y los mecanismos de seguimiento y control. Tendrá una duración estimada de 42 semanas y estará compuesto por seis fases parcialmente solapadas.

#### Fase 1 - Iniciación (Semanas 1 a 3)

Se realizará la constitución formal del proyecto y del equipo de trabajo, junto con la definición inicial de objetivos, alcance, interesados, organización y presupuesto. Durante esta fase se elaborará y aprobará el

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

Acta de Proyecto, estableciendo la autoridad del PM y las condiciones generales para el desarrollo del proyecto.

**Hito de cierre:** Acta de Proyecto aprobada y firmada por el Sponsor.

## **Fase 2 - Planificación (Semanas 4 a 8)**

Se realizará el relevamiento y análisis de requisitos con la institución piloto, la definición detallada del alcance del MVP y la elaboración de los principales instrumentos de planificación y control del proyecto. Se establecerán la EDT, el cronograma, la matriz de riesgos, el plan de comunicaciones, la matriz de costos y las líneas base de alcance, tiempo y costo.

El alcance del MVP quedará formalmente congelado al finalizar esta fase. Los cambios posteriores deberán gestionarse mediante el mecanismo de control de cambios establecido en el proyecto.

**Hito de cierre:** Plan del Proyecto aprobado y línea base del alcance del MVP establecida.

## **Fase 3 - Diseño (Semanas 7 a 12)**

Esta fase se desarrollará parcialmente en paralelo con la planificación y comprenderá el diseño de la arquitectura tecnológica, el modelo de datos, la infraestructura, los mecanismos de seguridad y la experiencia de usuario. Se elaborarán wireframes y prototipos de alta fidelidad que serán validados con usuarios representativos de la institución piloto.

**Hito de cierre:** Arquitectura y diseño técnico aprobados; prototipo validado.

## **Fase 4 - Desarrollo iterativo (Semanas 10 a 32)**

Se realizará la construcción progresiva de los cinco módulos core definidos para el MVP, respetando su dependencia funcional:

1. Gestión de Convocatorias.
2. Gestión de Postulaciones.
3. Validación Documental.
4. Evaluación y Asignación.
5. Reportes e Indicadores.

Cada módulo será desarrollado, integrado y validado progresivamente antes de continuar con los componentes dependientes. En paralelo se completará el modelo de datos, las integraciones necesarias, la infraestructura y los mecanismos de seguridad.

Las sucesivas versiones internas de la solución serán utilizadas para validar funcionalidad y detectar desvíos respecto del alcance aprobado. El MVP no será puesto a disposición del público general y se utilizará exclusivamente para validaciones controladas con la institución piloto y beta testers autorizados.

**Hito de cierre:** Cinco módulos integrados y operativos en ambiente de testing.

## **Fase 5 - Testing, QA y UAT (Semanas 30 a 38)**

Se ejecutará el plan integral de pruebas sobre la solución desarrollada, contemplando pruebas funcionales, de regresión, carga, performance y seguridad. Posteriormente se realizará la aceptación de usuario con la

|                                                                                             |                                                                                       |            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UTN.BA | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                             | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                             | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

institución piloto, verificando el cumplimiento de los requisitos definidos y de los criterios de aceptación del proyecto.

Los defectos críticos deberán encontrarse resueltos antes de la aprobación definitiva de esta fase.

**Hito de cierre:** Informe de QA aprobado y Acta de Aceptación de Usuario firmada.

#### **Fase 6 - Implementación y Cierre (Semanas 37 a 42)**

Una vez aprobados los resultados de QA y UAT, se realizará la preparación y puesta en marcha de la solución en el ambiente productivo, junto con la capacitación del personal de la institución piloto y el monitoreo inicial de estabilización.

Finalmente se completará la documentación final, el registro de lecciones aprendidas y las actividades administrativas necesarias para formalizar el cierre del proyecto.

**Hito de cierre:** Plataforma operativa en producción y Acta de Cierre firmada por el Sponsor.

Tabla de Cronograma del Proyecto

|                                                                                   |                                                                                       |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                   | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                   | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

|    |                                                                                   | Name                                              | Work                 | Duration        | Cost              | Start                 | Finish                | CV Percent | Resource Names                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  | <b>Beca360</b>                                    | <b>4,432.16 h...</b> | <b>273 days</b> | <b>£194498.33</b> | <b>30/03/26 08:00</b> | <b>14/04/27 16:00</b> | <b>0 %</b> |                                                                                                          |
| 2  |  | <b>1. Iniciación</b>                              | <b>216.16 hours</b>  | <b>28 days</b>  | <b>£57489.60</b>  | <b>30/03/26 08:00</b> | <b>06/05/26 16:00</b> | <b>0 %</b> |                                                                                                          |
| 3  |                                                                                   | Constitución del equipo                           | 40.16 hours          | 7 days          | £21209.60         | 30/03/26 08:00        | 07/04/26 16:00        | 0%         | Sponsor[36%];Project Manager[36%]                                                                        |
| 4  |                                                                                   | Elaboración del Acta de Proyecto                  | 80 hours             | 7 days          | £4800.00          | 07/04/26 16:00        | 16/04/26 16:00        | 0%         | Project Manager[143%]                                                                                    |
| 5  |                                                                                   | Identificación y análisis inicial de interesados  | 40 hours             | 7 days          | £1800.00          | 07/04/26 16:00        | 16/04/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[36%];Project Manager[36%]                                                             |
| 6  |                                                                                   | Definición inicial del presupuesto                | 40 hours             | 7 days          | £21200.00         | 16/04/26 16:00        | 27/04/26 16:00        | 0%         | Project Manager[36%];Sponsor[36%]                                                                        |
| 7  |                                                                                   | Revisión y aprobación del Acta de Proyecto        | 16 hours             | 7 days          | £3480.00          | 27/04/26 16:00        | 06/05/26 16:00        | 0%         | Project Manager[14%];Sponsor[14%]                                                                        |
| 8  |                                                                                   | Hito: Acta de Proyecto aprobada                   | 0 hours              | 0 days          | £0.00             | 06/05/26 16:00        | 06/05/26 16:00        | 0%         | Sponsor[0%]                                                                                              |
| 9  |  | <b>2. Planificación</b>                           | <b>510 hours</b>     | <b>42 days</b>  | <b>£45700.00</b>  | <b>06/05/26 16:00</b> | <b>03/07/26 16:00</b> | <b>0 %</b> |                                                                                                          |
| 10 |                                                                                   | Relevamiento de requisitos                        | 120 hours            | 7 days          | £1800.00          | 06/05/26 16:00        | 15/05/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[107%];Institución Piloto[107%]                                                        |
| 11 |                                                                                   | Análisis y documentación de requisitos            | 120 hours            | 7 days          | £5400.00          | 15/05/26 16:00        | 26/05/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[107%];Project Manager[107%]                                                           |
| 12 |                                                                                   | Definición del alcance del MVP                    | 40 hours             | 7 days          | £2000.00          | 26/05/26 16:00        | 04/06/26 16:00        | 0%         | Product Owner[36%];Project Manager[36%]                                                                  |
| 13 |                                                                                   | Elaboración de EDT                                | 40 hours             | 7 days          | £2400.00          | 26/05/26 16:00        | 04/06/26 16:00        | 0%         | Project Manager[71%]                                                                                     |
| 14 |                                                                                   | Elaboración del plan de riesgos                   | 40 hours             | 7 days          | £2400.00          | 26/05/26 16:00        | 04/06/26 16:00        | 0%         | Project Manager[71%]                                                                                     |
| 15 |                                                                                   | Elaboración del plan de comunicaciones            | 40 hours             | 7 days          | £2400.00          | 26/05/26 16:00        | 04/06/26 16:00        | 0%         | Project Manager[71%]                                                                                     |
| 16 |                                                                                   | Elaboración de matriz de costos                   | 40 hours             | 7 days          | £1600.00          | 26/05/26 16:00        | 04/06/26 16:00        | 0%         | Finanzas[36%];Project Manager[36%]                                                                       |
| 17 |                                                                                   | Elaboración del cronograma                        | 20 hours             | 7 days          | £1200.00          | 04/06/26 16:00        | 15/06/26 16:00        | 0%         | Project Manager[36%]                                                                                     |
| 18 |                                                                                   | Definición de líneas base                         | 40 hours             | 7 days          | £21200.00         | 15/06/26 16:00        | 24/06/26 16:00        | 0%         | Project Manager[36%];Sponsor[36%]                                                                        |
| 19 |                                                                                   | Aprobación del Plan del Proyecto                  | 10 hours             | 7 days          | £5300.00          | 24/06/26 16:00        | 03/07/26 16:00        | 0%         | Project Manager[9%];Sponsor[9%]                                                                          |
| 20 |                                                                                   | Hito: Alcance del MVP congelado                   | 0 hours              | 0 days          | £0.00             | 03/07/26 16:00        | 03/07/26 16:00        | 0%         | Product Owner;Sponsor                                                                                    |
| 21 |                                                                                   | <b>3. Diseño</b>                                  | <b>616 hours</b>     | <b>35 days</b>  | <b>£15623.88</b>  | <b>26/05/26 16:00</b> | <b>14/07/26 16:00</b> | <b>0 %</b> |                                                                                                          |
| 22 |                                                                                   | Diseño de arquitectura                            | 112 hours            | 14 days         | £2800.00          | 26/05/26 16:00        | 15/06/26 16:00        | 0%         | Arquitecto de Software                                                                                   |
| 23 |                                                                                   | Diseño de infraestructura cloud                   | 80 hours             | 7 days          | £1800.00          | 15/06/26 16:00        | 24/06/26 16:00        | 0%         | Arquitecto de Software[71%];DevOps[71%]                                                                  |
| 24 |                                                                                   | Diseño de seguridad                               | 80 hours             | 7 days          | £2000.00          | 15/06/26 16:00        | 24/06/26 16:00        | 0%         | Responsable de Seguridad[143%]                                                                           |
| 25 |                                                                                   | Diseño de modelo de datos                         | 80 hours             | 7 days          | £2000.00          | 15/06/26 16:00        | 24/06/26 16:00        | 0%         | Arquitecto de Base de Datos[71%];Arquitecto de Software[71%]                                             |
| 26 |                                                                                   | Diseño UX/UI                                      | 120 hours            | 14 days         | £3237.21          | 26/05/26 16:00        | 15/06/26 16:00        | 0%         | Product Owner[37%];Desarrollador Frontend[70%]                                                           |
| 27 |                                                                                   | Elaboración de prototipo de alta fidelidad        | 80 hours             | 7 days          | £2266.67          | 15/06/26 16:00        | 24/06/26 16:00        | 0%         | Product Owner[60%];Desarrollador Frontend[83%]                                                           |
| 28 |                                                                                   | Validación del prototipo                          | 40 hours             | 7 days          | £800.00           | 24/06/26 16:00        | 03/07/26 16:00        | 0%         | Institución Piloto[36%];Product Owner[36%]                                                               |
| 29 |                                                                                   | Aprobación de arquitectura y diseño               | 24 hours             | 7 days          | £720.00           | 03/07/26 16:00        | 14/07/26 16:00        | 0%         | Arquitecto de Software[14%];Product Owner[14%];Responsable de Seguridad[14%]                             |
| 30 |                                                                                   | Hito: Diseño aprobado                             | 0 hours              | 0 days          | £0.00             | 14/07/26 16:00        | 14/07/26 16:00        | 0%         | Project Manager;Sponsor                                                                                  |
| 31 |                                                                                   | <b>4. Desarrollo iterativo</b>                    | <b>1,800 hours</b>   | <b>147 days</b> | <b>£41544.00</b>  | <b>14/07/26 16:00</b> | <b>04/02/27 16:00</b> | <b>0 %</b> |                                                                                                          |
| 32 |                                                                                   | Preparación del entorno de desarrollo             | 40 hours             | 4 days          | £800.00           | 14/07/26 16:00        | 20/07/26 16:00        | 0%         | DevOps[42%];Desarrollador Backend[42%];Desarrollador Frontend[42%]                                       |
| 33 |                                                                                   | Desarrollo Gestión de Convocatorias               | 240 hours            | 28 days         | £5200.00          | 14/07/26 16:00        | 21/08/26 16:00        | 0%         | Arquitecto de Base de Datos[36%];Desarrollador Backend[36%];Desarrollador Frontend[36%]                  |
| 34 |                                                                                   | Integración y validación Gestión de Convocatorias | 80 hours             | 7 days          | £2266.67          | 20/07/26 16:00        | 29/07/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[48%];Product Owner[48%];QA Consultant[48%]                                            |
| 35 |                                                                                   | Desarrollo Gestión de Postulaciones               | 240 hours            | 28 days         | £5200.00          | 21/08/26 16:00        | 30/09/26 16:00        | 0%         | Arquitecto de Base de Datos[36%];Desarrollador Backend[36%];Desarrollador Frontend[36%]                  |
| 36 |                                                                                   | Integración y validación Gestión de Postulaciones | 80 hours             | 7 days          | £2266.67          | 29/07/26 16:00        | 07/08/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[48%];Product Owner[48%];QA Consultant[48%]                                            |
| 37 |                                                                                   | Desarrollo Validación Documental                  | 240 hours            | 28 days         | £5200.00          | 30/09/26 16:00        | 09/11/26 16:00        | 0%         | Arquitecto de Base de Datos[36%];Desarrollador Backend[36%];Desarrollador Frontend[36%]                  |
| 38 |                                                                                   | Integración y validación Validación Documental    | 80 hours             | 7 days          | £2200.00          | 07/08/26 16:00        | 18/08/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[36%];Product Owner[36%];Responsable de Seguridad[36%];QA Consultant[36%]              |
| 39 |                                                                                   | Desarrollo Evaluación y Asignación                | 320 hours            | 35 days         | £7040.00          | 09/11/26 16:00        | 28/12/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[19%];Responsable de Seguridad[19%];Arquitecto de Base de Datos[19%];Desarrollador ... |
| 40 |                                                                                   | Integración y validación Evaluación y Asignación  | 80 hours             | 7 days          | £2266.67          | 18/08/26 16:00        | 27/08/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[48%];Product Owner[48%];QA Consultant[48%]                                            |
| 41 |                                                                                   | Desarrollo Reportes e Indicadores                 | 240 hours            | 28 days         | £5200.00          | 28/12/26 16:00        | 04/02/27 16:00        | 0%         | Arquitecto de Base de Datos[36%];Desarrollador Backend[36%];Desarrollador Frontend[36%]                  |
| 42 |                                                                                   | Integración de módulos y pruebas internas         | 160 hours            | 7 days          | £3904.00          | 27/08/26 16:00        | 07/09/26 16:00        | 0%         | Analista Funcional[57%];Product Owner[57%];Arquitecto de Software[57%];QA Consultant[57%];Soporte[...    |
| 43 |                                                                                   | Hito: MVP integrado en testing                    | 0 hours              | 0 days          | £0.00             | 04/02/27 16:00        | 04/02/27 16:00        | 0%         | Project Manager;Product Owner                                                                            |
| 44 |                                                                                   | <b>5. Testing, QA y UAT</b>                       | <b>750 hours</b>     | <b>35 days</b>  | <b>£16053.88</b>  | <b>04/02/27 16:00</b> | <b>25/03/27 16:00</b> | <b>0 %</b> |                                                                                                          |
| 45 |                                                                                   | Preparación del entorno de QA                     | 40 hours             | 7 days          | £700.00           | 04/02/27 16:00        | 15/02/27 16:00        | 0%         | DevOps[36%];QA Consultant[36%]                                                                           |
| 46 |                                                                                   | Pruebas funcionales                               | 110 hours            | 14 days         | £2681.25          | 15/02/27 16:00        | 05/03/27 16:00        | 0%         | Analista Funcional[8%];Product Owner[28%];DevOps[28%];QA Consultant[28%];Soporte[91%]                    |
| 47 |                                                                                   | Pruebas de regresión                              | 80 hours             | 7 days          | £1868.39          | 15/02/27 16:00        | 24/02/27 16:00        | 0%         | QA Consultant[48%];Analista Funcional[32%];Product Owner[32%];Soporte[32%]                               |
| 48 |                                                                                   | Pruebas de carga y performance                    | 80 hours             | 7 days          | £1633.33          | 15/02/27 16:00        | 24/02/27 16:00        | 0%         | DevOps[30%];QA Consultant[30%];Arquitecto de Software[42%];Desarrollador Backend[42%]                    |
| 49 |                                                                                   | Pruebas de seguridad / pentesting                 | 80 hours             | 7 days          | £946.67           | 15/02/27 16:00        | 24/02/27 16:00        | 0%         | Responsable de Seguridad[30%];QA Consultant[30%];Institución Piloto[42%];Soporte[42%]                    |
| 50 |                                                                                   | Corrección de defectos                            | 160 hours            | 14 days         | £3466.67          | 05/03/27 16:00        | 25/03/27 16:00        | 0%         | Arquitecto de Software[24%];Responsable de Seguridad[24%];Arquitecto de Base de Datos[24%];Desarroll...  |
| 51 |                                                                                   | UAT con institución piloto                        | 120 hours            | 7 days          | £2200.00          | 24/02/27 16:00        | 05/03/27 16:00        | 0%         | Institución Piloto[71%];Product Owner[71%];QA Consultant[71%]                                            |
| 52 |                                                                                   | Resolución de observaciones UAT                   | 80 hours             | 7 days          | £2557.58          | 05/03/27 16:00        | 16/03/27 16:00        | 0%         | QA Consultant[22%];Project Manager[30%];Product Owner[30%];Desarrollador Backend[30%];Desarrollad...     |
| 53 |                                                                                   | Hito: QA y UAT aprobados                          | 0 hours              | 0 days          | £0.00             | 16/03/27 16:00        | 16/03/27 16:00        | 0%         | Sponsor;Product Owner                                                                                    |
| 54 |                                                                                   | <b>6. Implementación y Cierre</b>                 | <b>540 hours</b>     | <b>21 days</b>  | <b>£18086.98</b>  | <b>16/03/27 16:00</b> | <b>14/04/27 16:00</b> | <b>0 %</b> |                                                                                                          |
| 55 |                                                                                   | Preparación del ambiente productivo               | 80 hours             | 7 days          | £2484.21          | 25/03/27 16:00        | 05/04/27 16:00        | 0%         | DevOps[38%];Analista Funcional[53%];Product Owner[53%]                                                   |
| 56 |                                                                                   | Despliegue productivo controlado                  | 80 hours             | 7 days          | £1800.00          | 16/03/27 16:00        | 25/03/27 16:00        | 0%         | Arquitecto de Software[71%];DevOps[71%]                                                                  |
| 57 |                                                                                   | Capacitación institucional                        | 80 hours             | 7 days          | £2080.00          | 16/03/27 16:00        | 25/03/27 16:00        | 0%         | Soporte[71%];Product Owner[71%]                                                                          |
| 58 |                                                                                   | Monitoreo y estabilización inicial                | 200 hours            | 7 days          | £3967.74          | 05/04/27 16:00        | 14/04/27 16:00        | 0%         | DevOps[58%];Soporte[58%];Arquitecto de Software[81%];Desarrollador Backend[81%];Desarrollador Fro...     |
| 59 |                                                                                   | Documentación final                               | 80 hours             | 7 days          | £2207.63          | 05/04/27 16:00        | 14/04/27 16:00        | 0%         | Project Manager[9%];Desarrollador Backend[12%];Desarrollador Frontend[12%];Product Owner[12%];Arq...     |
| 60 |                                                                                   | Lecciones aprendidas                              | 10 hours             | 7 days          | £247.39           | 05/04/27 16:00        | 14/04/27 16:00        | 0%         | Project Manager[0%];Product Owner[3%];Arquitecto de Software[3%];Responsable de Seguridad[3%];Arq...     |
| 61 |                                                                                   | Acta de cierre                                    | 10 hours             | 7 days          | £5300.00          | 25/03/27 16:00        | 05/04/27 16:00        | 0%         | Project Manager[9%];Sponsor[9%]                                                                          |
| 62 |                                                                                   | Hito: Proyecto cerrado                            | 0 hours              | 0 days          | £0.00             | 14/04/27 16:00        | 14/04/27 16:00        | 0%         | Sponsor                                                                                                  |



Presupuesto

|                             | SUELDO BRUTO | SUELDO BRUTO C/SAC | CS PV (36,88%) | HS MENSUALES | VALOR HORA  |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|-------------|
| Project Manager             | \$ 1.980,00  | \$ -               | \$ -           | 33           | \$ 60,00    |
| Analista Funcional          | \$ 900,00    | \$ -               | \$ -           | 30           | \$ 30,00    |
| Sponsor                     | \$ 6.000,00  | \$ -               | \$ -           | 6            | \$ 1.000,00 |
| Institución Piloto          | \$ -         | \$ -               | \$ -           | 11           | \$ -        |
| Product Owner               | \$ 1.360,00  | \$ -               | \$ -           | 34           | \$ 40,00    |
| Finanzas                    | \$ 200,00    | \$ -               | \$ -           | 10           | \$ 20,00    |
| Arquitecto de Software      | \$ 750,00    | \$ -               | \$ -           | 30           | \$ 25,00    |
| DevOps                      | \$ 340,00    | \$ -               | \$ -           | 17           | \$ 20,00    |
| Responsable de Seguridad    | \$ 425,00    | \$ -               | \$ -           | 17           | \$ 25,00    |
| Arquitecto de Base de Datos | \$ 875,00    | \$ -               | \$ -           | 35           | \$ 25,00    |
| Desarrollador Backend       | \$ 800,00    | \$ -               | \$ -           | 40           | \$ 20,00    |
| Desarrollador Frontend      | \$ 940,00    | \$ -               | \$ -           | 47           | \$ 20,00    |
| QA Consultant               | \$ 875,00    | \$ -               | \$ -           | 25           | \$ 35,00    |
| Soporte                     | \$ 204,00    | \$ -               | \$ -           | 17           | \$ 12,00    |

1) HORAS (Sale de Project)

| Meses                       | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Project Manager             | 144    | 135    | 132    | 2      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 20     | 7      |
| Analista Funcional          | 20     | 120    | 0      | 35     | 75     | 22     | 0      | 23     | 30     | 0      | 24     | 20     | 12     |
| Sponsor                     | 42     | 5      | 23     | 2      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 3      | 2      |
| Institución Piloto          | 0      | 0      | 60     | 12     | 8      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 36     | 28     | 0      |
| Product Owner               | 0      | 0      | 18     | 89     | 51     | 75     | 22     | 0      | 0      | 0      | 51     | 113    | 21     |
| Finanzas                    | 0      | 9      | 11     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Arquitecto de Software      | 0      | 25     | 167    | 8      | 10     | 22     | 0      | 0      | 0      | 0      | 23     | 67     | 65     |
| DevOps                      | 0      | 0      | 40     | 13     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 57     | 64     | 41     |
| Responsable de Seguridad    | 0      | 0      | 40     | 13     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 57     | 64     | 41     |
| Arquitecto de Base de Datos | 0      | 0      | 40     | 38     | 60     | 63     | 63     | 40     | 40     | 60     | 11     | 27     | 20     |
| Desarrollador Backend       | 0      | 0      | 0      | 51     | 60     | 63     | 63     | 40     | 40     | 60     | 35     | 44     | 54     |
| Desarrollador Frontend      | 0      | 18     | 107    | 51     | 60     | 63     | 63     | 40     | 40     | 60     | 11     | 44     | 54     |
| QA Consultant               | 0      | 0      | 0      | 35     | 75     | 22     | 0      | 0      | 0      | 0      | 107    | 73     | 2      |
| Soporte                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 10     | 22     | 0      | 23     | 30     | 0      | 58     | 40     | 32     |
| TOTAL                       | 206    | 312    | 638    | 349    | 409    | 352    | 211    | 166    | 180    | 180    | 470    | 607    | 351    |

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS UNIFORME

| Meses                       | Apr-26       | May-26       | Jun-26       | Jul-26       | Aug-26       | Sep-26       | Oct-26       | Nov-26       | Dec-26       | Jan-27       | Feb-27       | Mar-27       | Apr-27       |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Project Manager             | \$ 3.404,94  | \$ 5.156,99  | \$ 10.545,39 | \$ 5.768,56  | \$ 6.760,29  | \$ 5.818,14  | \$ 3.487,58  | \$ 2.743,78  | \$ 2.975,19  | \$ 2.975,19  | \$ 7.768,55  | \$ 10.032,99 | \$ 5.801,62  |
| Analista Funcional          | \$ 1.364,05  | \$ 2.065,94  | \$ 4.224,58  | \$ 2.310,94  | \$ 2.708,23  | \$ 2.330,80  | \$ 1.397,16  | \$ 1.099,19  | \$ 1.191,89  | \$ 1.191,89  | \$ 3.112,15  | \$ 4.019,31  | \$ 2.324,18  |
| Sponsor                     | \$ 4.150,99  | \$ 6.286,94  | \$ 12.855,98 | \$ 7.032,50  | \$ 8.241,53  | \$ 7.092,95  | \$ 4.251,74  | \$ 3.344,97  | \$ 3.627,08  | \$ 3.627,08  | \$ 9.470,70  | \$ 12.231,31 | \$ 7.072,80  |
| Institución Piloto          | \$ 297,71    | \$ 450,90    | \$ 922,03    | \$ 504,37    | \$ 591,08    | \$ 508,71    | \$ 304,94    | \$ 239,90    | \$ 260,13    | \$ 260,13    | \$ 679,24    | \$ 877,23    | \$ 507,26    |
| Product Owner               | \$ 1.723,60  | \$ 2.610,50  | \$ 5.338,15  | \$ 2.920,08  | \$ 3.422,10  | \$ 2.945,18  | \$ 1.765,44  | \$ 1.388,92  | \$ 1.506,06  | \$ 1.506,06  | \$ 3.932,49  | \$ 5.078,77  | \$ 2.936,82  |
| Finanzas                    | \$ 40,91     | \$ 61,96     | \$ 126,71    | \$ 69,31     | \$ 81,23     | \$ 69,91     | \$ 41,90     | \$ 32,97     | \$ 35,75     | \$ 35,75     | \$ 93,34     | \$ 120,55    | \$ 69,71     |
| Arquitecto de Software      | \$ 1.230,07  | \$ 1.863,02  | \$ 3.809,63  | \$ 2.083,95  | \$ 2.442,22  | \$ 2.101,86  | \$ 1.259,92  | \$ 991,22    | \$ 1.074,82  | \$ 1.074,82  | \$ 2.806,47  | \$ 3.624,52  | \$ 2.095,89  |
| DevOps                      | \$ 792,27    | \$ 1.199,95  | \$ 2.453,74  | \$ 1.342,25  | \$ 1.573,01  | \$ 1.353,79  | \$ 811,50    | \$ 638,43    | \$ 692,28    | \$ 692,28    | \$ 1.807,62  | \$ 2.334,52  | \$ 1.349,94  |
| Responsable de Seguridad    | \$ 842,25    | \$ 1.275,64  | \$ 2.608,53  | \$ 1.426,92  | \$ 1.672,24  | \$ 1.439,19  | \$ 862,69    | \$ 678,71    | \$ 735,95    | \$ 735,95    | \$ 1.921,64  | \$ 2.481,78  | \$ 1.435,10  |
| Arquitecto de Base de Datos | \$ 1.369,47  | \$ 2.074,15  | \$ 4.241,37  | \$ 2.320,12  | \$ 2.719,00  | \$ 2.340,06  | \$ 1.402,71  | \$ 1.103,55  | \$ 1.196,62  | \$ 1.196,62  | \$ 3.124,52  | \$ 4.035,28  | \$ 2.333,42  |
| Desarrollador Backend       | \$ 1.531,73  | \$ 2.319,90  | \$ 4.743,90  | \$ 2.595,02  | \$ 3.041,15  | \$ 2.617,32  | \$ 1.568,91  | \$ 1.234,31  | \$ 1.338,40  | \$ 1.338,40  | \$ 3.494,72  | \$ 4.513,40  | \$ 2.609,89  |
| Desarrollador Frontend      | \$ 1.697,10  | \$ 2.570,37  | \$ 5.256,07  | \$ 2.875,19  | \$ 3.369,49  | \$ 2.899,90  | \$ 1.738,29  | \$ 1.367,57  | \$ 1.482,90  | \$ 1.482,90  | \$ 3.872,03  | \$ 5.000,68  | \$ 2.891,66  |
| QA Consultant               | \$ 1.249,35  | \$ 1.892,23  | \$ 3.869,36  | \$ 2.116,62  | \$ 2.480,51  | \$ 2.134,82  | \$ 1.279,68  | \$ 1.006,76  | \$ 1.091,67  | \$ 1.091,67  | \$ 2.850,47  | \$ 3.681,35  | \$ 2.128,75  |
| Soporte                     | \$ 695,48    | \$ 1.053,36  | \$ 2.153,98  | \$ 1.178,27  | \$ 1.380,84  | \$ 1.188,40  | \$ 712,37    | \$ 560,44    | \$ 607,71    | \$ 607,71    | \$ 1.586,79  | \$ 2.049,32  | \$ 1.185,03  |
| Total                       | \$ 20.389,93 | \$ 30.881,84 | \$ 63.149,40 | \$ 34.544,11 | \$ 40.482,92 | \$ 34.841,05 | \$ 20.884,83 | \$ 16.430,72 | \$ 17.816,45 | \$ 17.816,45 | \$ 46.520,72 | \$ 60.081,01 | \$ 34.742,07 |
| TOTAL PROYECTO              | \$ 29.340,30 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

| Porcentaje distribución de hs sobre total |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resource Name                             | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 |
| Project Manager                           | 69.90% | 43.27% | 20.69% | 0.57%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 3.29%  | 1.99%  |
| Analista Funcional                        | 9.71%  | 38.46% | 0.00%  | 10.03% | 18.34% | 6.25%  | 0.00%  | 13.86% | 16.67% | 0.00%  | 5.11%  | 3.29%  | 3.42%  |
| Sponsor                                   | 20.39% | 1.60%  | 3.61%  | 0.57%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.49%  | 0.57%  |
| Institución Piloto                        | 0.00%  | 0.00%  | 9.40%  | 3.44%  | 1.96%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 7.66%  | 4.61%  | 0.00%  |
| Product Owner                             | 0.00%  | 0.00%  | 2.82%  | 25.50% | 12.47% | 21.31% | 10.43% | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 10.85% | 18.62% | 5.98%  |
| Finanzas                                  | 0.00%  | 2.88%  | 1.72%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| Arquitecto de Software                    | 0.00%  | 8.01%  | 26.18% | 2.29%  | 2.44%  | 6.25%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 4.89%  | 11.04% | 18.52% |
| DevOps                                    | 0.00%  | 0.00%  | 6.27%  | 3.72%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 12.13% | 10.54% | 11.68% |
| Responsable de Seguridad                  | 0.00%  | 0.00%  | 6.27%  | 3.72%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 12.13% | 10.54% | 11.68% |
| Arquitecto de Base de Datos               | 0.00%  | 0.00%  | 6.27%  | 10.89% | 14.67% | 17.90% | 29.86% | 24.10% | 22.22% | 33.33% | 2.34%  | 4.45%  | 5.70%  |
| Desarrollador Backend                     | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 14.61% | 14.67% | 17.90% | 29.86% | 24.10% | 22.22% | 33.33% | 7.45%  | 7.25%  | 15.38% |
| Desarrollador Frontend                    | 0.00%  | 5.77%  | 16.77% | 14.61% | 14.67% | 17.90% | 29.86% | 24.10% | 22.22% | 33.33% | 2.34%  | 7.25%  | 15.38% |
| QA Consultant                             | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 10.03% | 18.34% | 6.25%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 22.77% | 12.03% | 0.57%  |
| Soporte                                   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 2.44%  | 6.25%  | 0.00%  | 13.86% | 16.67% | 0.00%  | 12.34% | 6.59%  | 9.12%  |
| Total                                     | 4,65%  | 7,04%  | 14,40% | 7,88%  | 9,23%  | 7,94%  | 4,76%  | 3,75%  | 4,06%  | 4,06%  | 10,61% | 13,70% | 7,92%  |

| Equipo de Proyecto          | Rol / Mes | Meses        |             |              |             |             |             |             |             |             |             |              |             |               | Costos Totales por categoría |
|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------------------------|
|                             |           | Apr-26       | May-26      | Jun-26       | Jul-26      | Aug-26      | Sep-26      | Oct-26      | Nov-26      | Dec-26      | Jan-27      | Feb-27       | Mar-27      | Apr-27        |                              |
| Project Manager             | \$        | 3.484.94     | \$ 5.156.99 | \$ 10.545.39 | \$ 5.768.56 | \$ 6.760.29 | \$ 5.818.14 | \$ 3.487.58 | \$ 2.743.78 | \$ 2.975.19 | \$ 7.768.55 | \$ 10.032.99 | \$ 5.801.62 | \$ 5.801.62   | \$73.239.20                  |
| Analista Funcional          | \$        | 1.364.05     | \$ 2.085.94 | \$ 4.224.58  | \$ 2.310.94 | \$ 2.708.23 | \$ 2.330.80 | \$ 1.397.16 | \$ 1.099.19 | \$ 1.191.89 | \$ 3.112.15 | \$ 4.019.31  | \$ 2.334.18 | \$ 2.334.18   | \$29.340.30                  |
| Sponsor                     | \$        | 4.150.99     | \$ 6.286.94 | \$ 12.855.98 | \$ 7.032.50 | \$ 8.241.53 | \$ 7.092.95 | \$ 4.251.74 | \$ 3.344.97 | \$ 3.627.08 | \$ 9.470.70 | \$ 12.231.31 | \$ 7.072.80 | \$ 889.286.58 | \$89.286.58                  |
| Institución Piloto          | \$        | 297.71       | \$ 450.90   | \$ 922.03    | \$ 504.37   | \$ 591.08   | \$ 508.71   | \$ 304.94   | \$ 239.90   | \$ 260.13   | \$ 679.24   | \$ 877.23    | \$ 507.26   | \$ 507.26     | \$6.403.65                   |
| Product Owner               | \$        | 1.723.60     | \$ 2.610.50 | \$ 5.338.15  | \$ 2.920.08 | \$ 3.422.10 | \$ 2.945.18 | \$ 1.765.44 | \$ 1.388.92 | \$ 1.506.06 | \$ 3.932.49 | \$ 5.078.77  | \$ 2.936.82 | \$ 37.074.18  | \$37.074.18                  |
| Finanzas                    | \$        | 40.91        | \$ 61.96    | \$ 126.71    | \$ 69.31    | \$ 81.23    | \$ 69.91    | \$ 41.90    | \$ 32.97    | \$ 35.75    | \$ 93.34    | \$ 120.55    | \$ 69.71    | \$ 69.71      | \$889.00                     |
| Arquitecto de Software      | \$        | 1.230.07     | \$ 1.863.02 | \$ 3.889.63  | \$ 2.083.95 | \$ 2.442.22 | \$ 2.101.86 | \$ 1.259.92 | \$ 991.22   | \$ 1.074.82 | \$ 1.074.82 | \$ 2.806.47  | \$ 3.624.52 | \$ 2.095.89   | \$26.458.40                  |
| DevOps                      | \$        | 792.27       | \$ 1.199.95 | \$ 2.453.74  | \$ 1.342.25 | \$ 1.573.01 | \$ 1.353.79 | \$ 811.50   | \$ 638.43   | \$ 692.28   | \$ 1.807.62 | \$ 2.334.52  | \$ 1.349.94 | \$ 1.349.94   | \$17.041.59                  |
| Responsable de Seguridad    | \$        | 842.25       | \$ 1.275.64 | \$ 2.608.53  | \$ 1.426.92 | \$ 1.672.24 | \$ 1.439.19 | \$ 862.69   | \$ 678.71   | \$ 735.95   | \$ 1.921.64 | \$ 2.481.78  | \$ 1.435.10 | \$ 1.435.10   | \$18.118.59                  |
| Arquitecto de Base de Datos | \$        | 1.369.47     | \$ 2.074.15 | \$ 4.241.37  | \$ 2.320.12 | \$ 2.719.00 | \$ 2.340.06 | \$ 1.402.71 | \$ 1.103.55 | \$ 1.196.62 | \$ 3.124.52 | \$ 4.035.28  | \$ 2.333.42 | \$ 29.456.89  | \$29.456.89                  |
| Desarrollador Backend       | \$        | 1.511.73     | \$ 2.319.90 | \$ 4.743.90  | \$ 2.595.02 | \$ 3.041.15 | \$ 2.617.32 | \$ 1.568.91 | \$ 1.234.31 | \$ 1.338.40 | \$ 3.494.72 | \$ 4.513.40  | \$ 2.609.89 | \$ 332.947.06 | \$332.947.06                 |
| Desarrollador Frontend      | \$        | 1.697.10     | \$ 2.570.37 | \$ 5.256.07  | \$ 2.875.19 | \$ 3.369.49 | \$ 2.899.90 | \$ 1.738.29 | \$ 1.367.57 | \$ 1.482.90 | \$ 3.872.03 | \$ 5.000.68  | \$ 2.891.66 | \$ 336.504.14 | \$336.504.14                 |
| QA Consultant               | \$        | 1.249.35     | \$ 1.892.23 | \$ 3.869.36  | \$ 2.116.62 | \$ 2.480.51 | \$ 2.134.82 | \$ 1.279.68 | \$ 1.006.76 | \$ 1.091.67 | \$ 2.850.47 | \$ 3.681.35  | \$ 2.128.75 | \$ 226.873.24 | \$226.873.24                 |
| Soporte                     | \$        | 695.48       | \$ 1.053.36 | \$ 2.153.98  | \$ 1.178.27 | \$ 1.380.84 | \$ 1.188.40 | \$ 712.37   | \$ 560.44   | \$ 607.71   | \$ 1.586.79 | \$ 2.049.32  | \$ 1.185.03 | \$ 114.959.68 | \$114.959.68                 |
| Totales Flujo de Fondos     | \$        | \$20.385.93  | \$30.881.84 | \$63.149.40  | \$34.544.11 | \$40.482.92 | \$34.841.05 | \$20.884.83 | \$16.430.72 | \$17.816.45 | \$17.816.45 | \$46.820.72  | \$60.081.01 | \$34.742.07   | \$438.581.49                 |
| Costo total del Proyecto    | \$        | \$438.581.49 |             |              |             |             |             |             |             |             |             |              |             |               | \$438.581.49                 |
| Promedio Costo Mensual      | \$        | \$33.737.04  |             |              |             |             |             |             |             |             |             |              |             |               | \$33.737.04                  |

Riesgos Identificados

Los 21 riesgos identificados y documentados en la matriz se agrupan en cinco grandes categorías:

Adopción y cambio organizacional (R1, R2, R13): resistencia del personal administrativo de las instituciones al cambio, baja adopción por parte de universidades y problemas de usabilidad para perfiles no técnicos. Todos de exposición Alta o Media, mitigables con gestión del cambio, onboarding institucional y diseño UX centrado en el usuario.

Técnicos y arquitecturales (R3, R4, R6, R14, R19, R21): ambigüedad en requisitos funcionales por diversidad institucional, problemas de integración con sistemas como SIU Guaraní, fallas de escalabilidad ante picos de convocatorias masivas, vendor lock-in con proveedor cloud, incumplimiento de SLAs de disponibilidad y ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales. Son los riesgos más críticos dado el modelo SaaS.

Gestión del proyecto (R7, R9, R12, R16, R17): retrasos en cronograma, scope creep por evolución del diseño conceptual, sobrecarga funcional del MVP, rotación de personal clave y falta de documentación técnica. Todos de exposición Alta.

Seguridad, legal y datos (R5, R11, R20): vulnerabilidades en datos sensibles de estudiantes, problemas normativos en tratamiento de datos personales (Ley 25.326) y pérdida o corrupción de datos en migraciones desde sistemas legacy.

Calidad y reporting (R8, R10, R15, R18): falta de definición de criterios de evaluación por institución, inconsistencia en datos cargados por estudiantes, falta de presupuesto garantizado y errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales

Supuestos

Los supuestos son condiciones que se asumen como verdaderas para poder planificar el proyecto, aunque no estén formalmente garantizadas. Si alguno de ellos se invalida, el proyecto debe ser revisado.

Sobre el negocio y el mercado

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

Las instituciones universitarias y fundaciones están dispuestas a adoptar soluciones SaaS para digitalizar la gestión de becas, y existe demanda real del mercado que justifica el modelo de negocio. Se asume que las instituciones cuentan con presupuesto destinado a transformación digital y que la decisión de contratación no depende exclusivamente del área de TI sino también de las autoridades académicas, que son más receptivas a este tipo de soluciones. Se asume también que el modelo de suscripción institucional es aceptable para el tipo de cliente objetivo, y que las instituciones están dispuestas a pagar una tarifa recurrente a cambio de eficiencia operativa.

### **Sobre los usuarios y la adopción**

Se asume que las instituciones contratantes designarán referentes internos (administradores del sistema) que actuarán como punto de contacto y facilitarán la adopción interna. Se asume que los usuarios administrativos, si bien pueden tener baja alfabetización digital, están dispuestos a capacitarse y adoptar la plataforma si reciben el soporte adecuado. En cuanto a los estudiantes, se asume que tienen acceso a internet y dispositivos desde los cuales pueden postularse sin requerir asistencia técnica permanente.

### **Sobre los requisitos funcionales**

Se asume que, si bien cada institución tiene reglas propias para la evaluación de becas, existe un conjunto de procesos comunes lo suficientemente amplio como para construir un motor de reglas configurable que los cubra sin necesidad de desarrollo a medida para cada cliente. Se asume que las instituciones piloto estarán disponibles y comprometidas para participar activamente en el relevamiento de requisitos, las pruebas de usabilidad y el UAT antes del lanzamiento.

### **Sobre la tecnología y la infraestructura**

Se asume que los proveedores de infraestructura cloud (AWS, GCP o Azure) mantendrán sus niveles de servicio actuales y que sus costos no sufrirán incrementos significativos durante el período de desarrollo. Se asume que SIU Guaraní expone o puede exponer interfaces de integración suficientes para implementar la conectividad requerida, y que las universidades que lo utilizan están en condiciones de habilitar esa integración. Se asume que el stack tecnológico elegido (arquitectura cloud-native, microservicios, APIs REST) es estable y cuenta con soporte activo de la comunidad durante el horizonte del proyecto.

### **Sobre el equipo del proyecto**

Se asume que el equipo de desarrollo permanecerá estable durante las fases críticas del proyecto, sin rotaciones significativas en roles clave como el Arquitecto de Software o los Desarrolladores Backend. Se asume que todos los integrantes del equipo tienen las habilidades declaradas en sus perfiles y que no será necesario invertir tiempo significativo en formación técnica previa al inicio del desarrollo. Se asume que el equipo puede trabajar de forma distribuida y que las herramientas de colaboración (Jira, Confluence, Git) son suficientes para garantizar la coordinación sin necesidad de presencialidad permanente.

### **Sobre el financiamiento y los recursos**

Se asume que el Sponsor o Comité Directivo garantizará el financiamiento del proyecto durante todo su ciclo de vida, sin interrupciones presupuestarias que obliguen a pausar o reducir el alcance. Se asume que el presupuesto aprobado contempla una reserva de contingencia de entre el 10% y el 15% para absorber imprevistos sin necesidad de solicitar fondos adicionales. Se asume que los recursos humanos necesarios están disponibles en el mercado local y que pueden incorporarse dentro de los plazos previstos en el cronograma.

### **Sobre el marco legal y normativo**

Se asume que la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina es la normativa de referencia principal aplicable al proyecto en su fase inicial, y que no habrá cambios regulatorios significativos en materia de privacidad durante el desarrollo. Se asume que las instituciones clientes son las responsables legales del

|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

tratamiento de los datos de sus estudiantes, y que Beca360 actúa como encargado del tratamiento, lo que simplifica el esquema de responsabilidad legal del producto.

### Sobre el contexto académico

Se asume que el proyecto conceptual desarrollado en el marco de la materia de Project Management es representativo de un proyecto real ejecutable, y que los entregables académicos (WBS, matriz de riesgos, evaluación de alternativas, roles y responsabilidades) serán consistentes entre sí y podrán ser defendidos como un plan de proyecto coherente ante la cátedra. Se asume que los criterios de evaluación de la materia priorizan la coherencia del modelo de negocio, la solidez del plan y la alineación entre documentos, más que la implementación técnica efectiva.

## Restricciones

**Alcance:** la plataforma es exclusivamente un sistema SaaS de gestión institucional de becas; no es un portal público ni un marketplace donde estudiantes buscan becas en el mercado. Cualquier funcionalidad que desvíe de ese modelo de negocio está fuera del alcance del MVP. El primer release contempla únicamente los módulos core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental, evaluación y reportes básicos.

**Tiempo:** el proyecto se enmarca en el ciclo académico de la materia de Project Management, lo que impone hitos fijos de entrega de documentación y entregables parciales. Cualquier retraso en documentación no puede impactar la presentación final del proyecto.

**Costo y recursos:** no existe financiamiento externo garantizado en esta etapa conceptual. El equipo es reducido (estimado en 8 a 11 personas) y no hay presupuesto aprobado para contrataciones adicionales fuera del núcleo definido. Las decisiones de arquitectura deben contemplar esta restricción (por ejemplo, priorizar soluciones cloud escalables sobre infraestructura on-premise propia).

**Tecnología:** la plataforma debe ser web-based, accesible desde navegador sin instalación en el cliente. Debe contemplar desde el diseño la capacidad de integración con SIU Guaraní u otros sistemas académicos universitarios argentinos, lo que restringe las elecciones de arquitectura de integración.

**Legal y normativo:** el sistema maneja datos personales y académicos sensibles, por lo que está sujeto a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina y sus equivalentes internacionales. Esta restricción impacta directamente el diseño de la base de datos, los flujos de consentimiento y las políticas de seguridad.

**Calidad:** el sistema no puede ser lanzado a producción sin pruebas de aceptación de usuario (UAT) validadas con al menos una institución piloto. La disponibilidad mínima aceptable en períodos de convocatoria es del 99,5%.

## Requerimientos Adicionales

### *Requerimientos no funcionales*

- **Disponibilidad:** el sistema debe estar disponible al menos el 99,5% del tiempo durante períodos de convocatoria activa, con un tiempo máximo de recuperación ante fallas (RTO) de 2 horas.
- **Performance:** el tiempo de respuesta de cualquier pantalla no debe superar los 3 segundos bajo carga normal, ni los 5 segundos bajo carga pico (convocatoria masiva simultánea).

|                                                                                   |                                                                                       |            |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                   | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                   | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

- **Escalabilidad:** la plataforma debe soportar al menos 1.000 postulaciones simultáneas sin degradación de performance, con capacidad de escalar horizontalmente ante demanda adicional.
- **Seguridad:** los datos en tránsito deben estar cifrados mediante TLS 1.2 o superior; los datos en reposo mediante AES-256. El sistema debe implementar autenticación multifactor para perfiles administrativos.
- **Compatibilidad:** la plataforma debe funcionar correctamente en las versiones actuales y la inmediata anterior de Chrome, Firefox, Safari y Edge, en desktop y dispositivos móviles (diseño responsivo).
- **Usabilidad:** cualquier acción principal del sistema debe poder realizarse en un máximo de 3 niveles de navegación. El sistema debe ser operable por usuarios sin formación técnica específica.
- **Accesibilidad:** la interfaz debe cumplir con el nivel AA de las pautas WCAG 2.1.
- **Portabilidad:** el sistema debe poder desplegarse en distintos proveedores cloud sin modificaciones significativas en el código fuente.

#### *Requerimientos legales y normativos*

- El sistema debe cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina, incluyendo implementación de consentimiento informado, derecho al olvido (eliminación de datos a solicitud) y registro de tratamiento de datos.
- El sistema debe mantener un log de auditoría inmutable de todas las acciones realizadas sobre datos sensibles de estudiantes.

#### *Requerimientos de integración*

- El sistema debe exponer una API REST documentada bajo el estándar OpenAPI/Swagger, consumible por sistemas de terceros.
- La integración con SIU Guaraní debe ser configurable por institución sin requerir desarrollo adicional para cada nuevo cliente.

#### *Requerimientos de soporte operativo*

- El sistema debe incluir un canal de soporte técnico (help desk) con tiempo máximo de respuesta de 2 horas ante incidentes críticos y 24 horas ante incidentes no críticos, en horario hábil.

### **Acciones de Calidad**

Las acciones de calidad del proyecto se organizarán mediante un esquema de gates de calidad por fase. Cada fase del proyecto debe cumplir un conjunto de criterios de calidad previamente definidos antes de poder avanzar a la siguiente. El Líder de Proyecto es responsable de verificar el cumplimiento de cada gate antes de autorizar el inicio de la fase siguiente.

**1. Fase de Planificación:** todos los documentos de planificación deben estar aprobados por el Sponsor (Project Charter, WBS, cronograma, plan de riesgos, plan de comunicaciones). Los requisitos funcionales deben estar validados por al menos un representante de la institución piloto.

**2. Fase de Diseño:** el prototipo de alta fidelidad debe estar aprobado por el Product Owner. El diseño de arquitectura debe contar con la validación del Arquitecto de Software y el Responsable de Seguridad.

**3. Fase de Desarrollo (por sprint):** cada funcionalidad entregada debe cumplir la Definition of Done (DoD): revisión de código por pares aprobada, cobertura de testing automatizado mínima del 70%, sin defectos críticos o graves abiertos, y validación funcional del Product Owner.



|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | <b>K4053</b>                                                                          |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

**4. Fase de Testing:** el Plan de Pruebas debe estar ejecutado en su totalidad. No pueden quedar defectos críticos abiertos al cierre del ciclo de QA. Las pruebas de carga deben confirmar disponibilidad  $\geq 99,5\%$  bajo carga pico simulada. La auditoría de seguridad (pentesting) debe estar completada sin hallazgos críticos sin resolver.

**5. Fase de UAT:** al menos una institución piloto debe haber completado un ciclo completo de convocatoria, postulación, evaluación y asignación en el sistema. El acta de aceptación del usuario debe estar firmada por el representante institucional.

**6. Cierre del Proyecto:** la documentación técnica y el manual de usuario deben estar entregados y aprobados. El plan de capacitación debe haberse ejecutado. El acta de cierre del proyecto debe contar con la firma del Sponsor.

#### Acciones de calidad transversales a todas las fases:

- Revisión semanal de métricas de calidad en reunión de equipo (defectos abiertos, cobertura de tests, desvíos de cronograma).
- Actualización del registro de lecciones aprendidas al cierre de cada sprint.
- Control de versiones de todos los documentos del proyecto en repositorio centralizado (Git / Confluence).

### Estrategia de Cambios al Alcance

El proyecto adopta una estrategia de alcance congelado para el MVP con gestión de releases iterativos para versiones posteriores.

**Congelamiento del alcance del MVP:** el alcance del primer release (MVP) se congela formalmente mediante firma del Sponsor y el Product Owner al cierre de la Fase de Planificación. Una vez congelado, ningún cambio funcional puede incorporarse al MVP. El documento de alcance firmado constituye la línea base de alcance y no puede modificarse sin activar el proceso de excepción descrito a continuación.

**Excepciones al congelamiento:** únicamente se admiten cambios al alcance del MVP en los siguientes casos: (a) vulnerabilidad de seguridad crítica que requiera modificación funcional para su mitigación; (b) cambio normativo legal o regulatorio de cumplimiento obligatorio; (c) falla técnica de diseño que impida la operación básica del sistema. Cualquier excepción debe ser documentada por el Líder de Proyecto, aprobada por el Sponsor y registrada en el Log de Cambios.

**Gestión de cambios no urgentes (Backlog de versiones futuras):** todos los cambios al alcance que no sean excepciones de emergencia son derivados al Backlog de Producto para su consideración en versiones posteriores (v2, v3). El Product Owner es responsable de registrar, priorizar y comunicar estos ítems a los interesados. Al cierre del proyecto, el Backlog de versiones futuras se entrega al Sponsor como insumo para la planificación del roadmap del producto.

**Log de Cambios:** el Líder de Proyecto mantiene un registro actualizado de todas las solicitudes de cambio recibidas, indicando para cada una: fecha de recepción, solicitante, descripción, clasificación (excepción / backlog futuro), decisión tomada y responsable de la decisión. Este log forma parte de los entregables de gestión del proyecto.



|                                                                                                    |                                                                                       |            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UTN.BA</b> | Plataforma Integral para la Gestión<br>y Administración de Becas Académicas (Beca360) |            |  |
|                                                                                                    | K4053                                                                                 |            |                                                                                     |
|                                                                                                    | Versión 1.8                                                                           | 27/08/2026 |                                                                                     |

Links útiles:

Canvas: <https://canvas.nicomad.work/s/5ef56ee7-b9aa-4942-94a6-1bf6a5134e3b>

EDT: <https://project.nicomad.work/es/shareable/o8tVnfJ0QLWMr-4SMGEUbw>

Organigrama:

<https://drive.google.com/file/d/1uA8r1NP0dlwu2A3Rz4slwe6QAbDHRTTrG/view?usp=sharing>

Aprobación:

\_\_\_\_\_  
Docente a cargo del Proyecto

Fecha: \_\_\_\_\_
